第24回 ALOS-2/4観測運用調整会議
資料2-4
ALOS-4 観測データ取得実績

報告対象観測期間：2026年1月19日～2026年7月19日

2026年10月15日
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
第一宇宙技術部門
JAXA 先進レーダ衛星プロジェクトチーム

ALOS-4 観測データ取得実績

1. はじめに

本資料は、ALOS-4（先進レーダ衛星「だいち4号」）において以下の期間に観測されたデータの取得実績を集計したものである。

【前提条件】

・観測期間　：2026年1月19日～2026年7月19日

・集計対象　：基本観測（日本域時系列観測、全球ベースマップ※、災害ベースマップ）

※全球ベースマップ10mの観測エリアC（青）、E（黄）、A（緑：パターン1）の観測が集計期間外

※全球ベースマップ6mは2026/4/13から観測エリアが変更（名称：世界フルポラ）となったが合わせて集計している。

カテゴリ別（防災、海洋、湿地、社会基盤と都市、森林、雪氷、地殻変動と火山、農業）に各テーマを集約。

（世界重点防災、海上風、湿地、全球マングローブマップ(GMWデータセット)、森林バイオマス推定、K&C、早期伐採検出(JJ-FAST)、ALOS-4 Ice、地殻変動、火山、水田メタン評価、水稲監視）

・固定PRF　：可変、固定の区別なしに集計

ALOS-4 観測データ取得実績

2. 観測データ取得実績対象期間の観測カレンダー

実績集計対象期間

■ 2年目　陸域/オープン回帰

回帰	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
年	2025			2026																						
回帰開始日	12/8	12/22	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16	3/30	4/13	4/27	5/11	5/25	6/8	6/22	7/6	7/20	8/3	8/17	8/31	9/14	9/28	10/12	10/26	11/9	11/23
内容	時系列観測		オープン回帰	時系列観測			オープン回帰	時系列観測			オープン回帰						時系列観測						災害ベースマップ	時系列観測	災害ベースマップ	時系列観測
	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域	陸域
降交	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1L	UW1R	UW1L	UW1R
	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF2
昇交	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1R	UW1L	UW1R	UW1L	UW1R
	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF2

■ 2年目　全球ベースマップ、世界フルポラ、災害ベースマップ、テーマ別

回帰	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
年	2025			2026																						
回帰開始日	12/8	12/22	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16	3/30	4/13	4/27	5/11	5/25	6/8	6/22	7/6	7/20	8/3	8/17	8/31	9/14	9/28	10/12	10/26	11/9	11/23
	全球&テーマ毎		全球ベース		テーマ毎				災害ベース	テーマ毎	世界フルポラ				テーマ毎		世界フルポラ				テーマ毎			テーマ毎	災害ベース	テーマ毎
降交	HBQ6R B	HBQ8R B	HBQ6R C	HBQ8R C					XB2R B		HBQ6R B	HBQ8R B	HBQ8R B	HBQ6R B			HBQ8R A	HBQ6R A	HBQ6R A	HBQ8R A					XB2R A	
降交 BG	HB6R B	HB8R B			HB6R C	HB8R C	HB6R A	HB8R A		HBQ6R B					HBQ6R B	HBQ8R B					HBQ8R B	HBQ6R A	HBQ6R A	HBQ8R A	HBQ8R A	HBQ6R B
	固定 PRF1	固定 PRF1			固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF1		固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2
昇交	テーマ毎									全球ベース		テーマ毎	全球ベース		テーマ毎	全球ベース		テーマ毎	全球ベース		テーマ毎	全球ベース		テーマ毎		災害ベース
										FW1R D	FW1R D	D2	FW1R B	FW1R B	D1,B1	FW1R A	FW1R A	B2,A2	FW1R C	FW1R C	A1,C1	FW1R E	FW1R E	C2,E2		
昇降 リカバリ																									FW1R B,D	FW1R D
昇降 BG	FW1R A	FW1R C	FW1R E	FW1R D	FW1R B	FW1R A	FW1R C	FW1R E	FW1R D			FW1R B			FW1R D			FW1R C			FW1R A			FW1R E	FW1R B	FW1R B
	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2	固定 PRF1	固定 PRF2

ALOS-4 観測データ取得実績

3. 観測データ取得実績

基本観測、テーマ別の計画状況、計画/公開率等を以下に示す。

全体

単位：サブシーン

基本観測	① 中期観測計画	② 日々観測計画 (③+④)	カタログ		計画率 ②÷①	カタログ公開率 ③÷②
			③公開	④非公開		
基本観測	269,014	167,310	130,435	36,875	62.2%	78.0%
カテゴリ別	328,535	235,965	211,597	24,368	71.8%	89.7%

【計画率】中期計画に対する日々採用に影響のあった主な事象

・緊急観測（三陸沖地震、台風6号水害等）、衛星異常検出に伴う観測制約、その他観測制約

【カタログ公開率】日々採用に対するカタログ公開に影響のあった主な事象

・データの欠損、衛星異常検出に伴う観測制約

ALOS-4 観測データ取得実績

3. 観測データ取得実績

各計画の計画状況、計画/公開率等を以下に示す。

基本観測シナリオ一覧

単位：サブシーン

基本観測	衛星方向 A/D	① 中期観測計画	② 日々観測計画 (③+④)	カタログ		計画率 ②÷①	カタログ公開率 ③÷②
				③公開	④非公開		
日本域時系列観測	A	10,260	9,764	7,436	2,328	95.2%	76.2%
	D	9,444	8,972	5,364	3,608	95.0%	59.8%
災害ベースマップ	A	―	―	―	―	―	―
	D	949	720	674	46	75.9%	93.6%
全球ベースマップ10m	A	153,927	100,020 (233,511)	75,183 (196,335)	24,837 (37,176)	65.0%	75.2% (84.1%)
全球ベースマップ6m	D	94,434	47,834 (60, 946)	41,778 (53,546)	6,056 (7,400)	50.7%	87.3% (87.9%)

()内は10m、6mで観測したカテゴリ別のデータも合わせた集計結果

ALOS-4 観測データ取得実績

3. 観測データ取得実績

各計画の計画状況、計画/公開率等を以下に示す。

カテゴリ別一覧

単位：サブシーン

カテゴリ	衛星方向 A/D	① 中期観測計画	② 日々観測計画 (③+④)	カタログ		計画率 ②÷①	カタログ公開率 ③÷②
				③公開	④非公開		
防災	A	4,431	2,328	2,084	244	52.5%	89.5%
	D	12,876	5,031	4,707	324	39.1%	93.6%
海洋	A	107	18	18	0	16.8%	100.0%
	D	1,106	704	704	0	63.7%	100.0%
湿地	A	67,551	31,086	28,164	2,922	46.0%	90.6%
	D	4,276	4,144	3,522	622	96.9%	85.0%
社会基盤と都市	A	150	120	108	12	80.0%	90.0%
	D	162	116	94	22	71.6%	81.0%
森林	A	8,698	7,708	7,123	585	88.6%	92.4%
	D	14,508	12,096	11,072	1,024	83.4%	91.5%
雪氷	A	115,528	92,753	83,823	8,930	80.3%	90.4%
	D	20,785	16,729	14,948	1,781	80.5%	89.4%
地殻変動と火山	A	51,813	42,859	37,193	5,666	82.7%	86.8%
	D	8,298	7,479	6,663	816	90.1%	89.1%
農業	A	14,338	11,176	9,852	1,324	77.9%	88.2%
	D	3,908	1,618	1,522	96	41.4%	94.1%


ALOS-4 観測データ取得実績

日本域時系列観測（昇交軌道（北行））


基本観測	観測頻度	分解能	観測モード
日本	20回/年	3m/200km幅（オフナディア角 33.7° ）	高分解能（HH+HV/84MHz）

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
9,764	7,436	76.2%

【観測エリア】

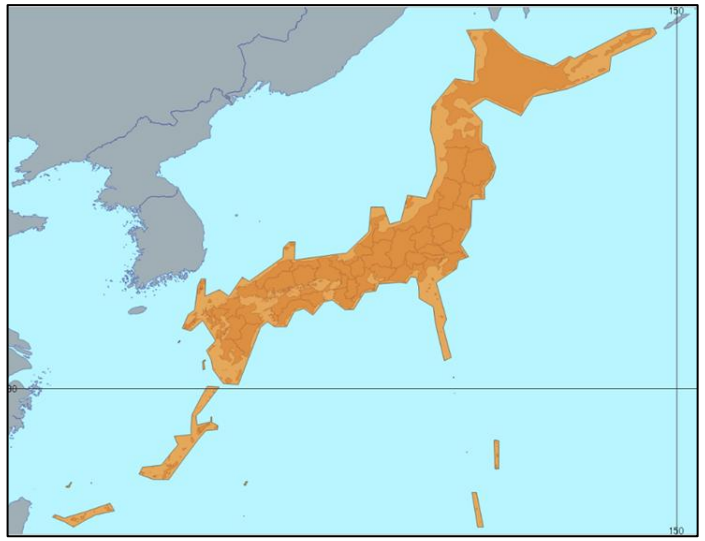

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

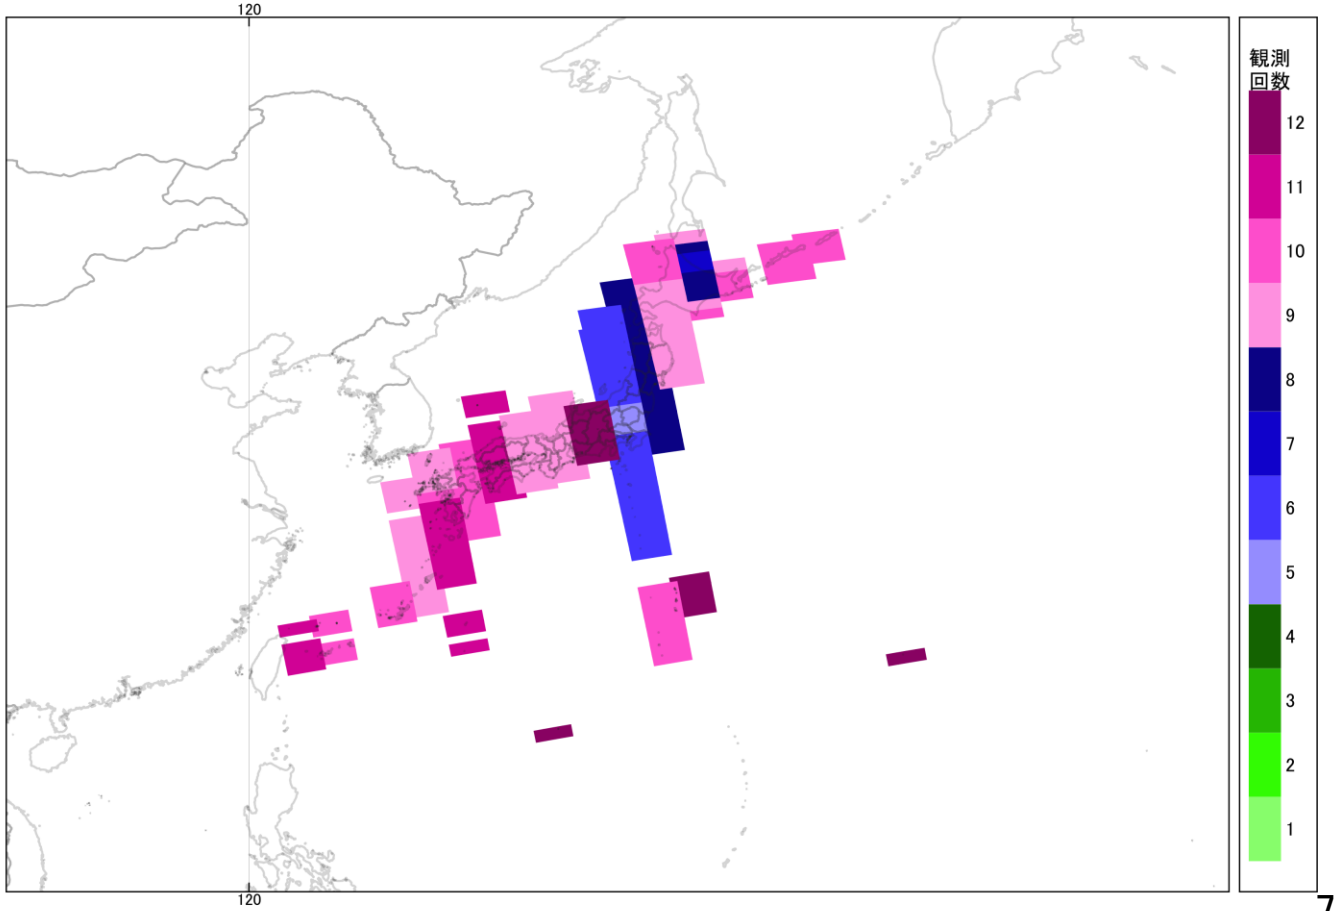


ALOS-4 観測データ取得実績

日本域時系列観測（降交軌道（南行））


基本観測	観測頻度	分解能	観測モード
日本	20回/年	3m/200km幅（オフナディア角 33.7° ）	高分解能（HH+HV/84MHz）

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
8,972	5,364	59.8%

【観測エリア】

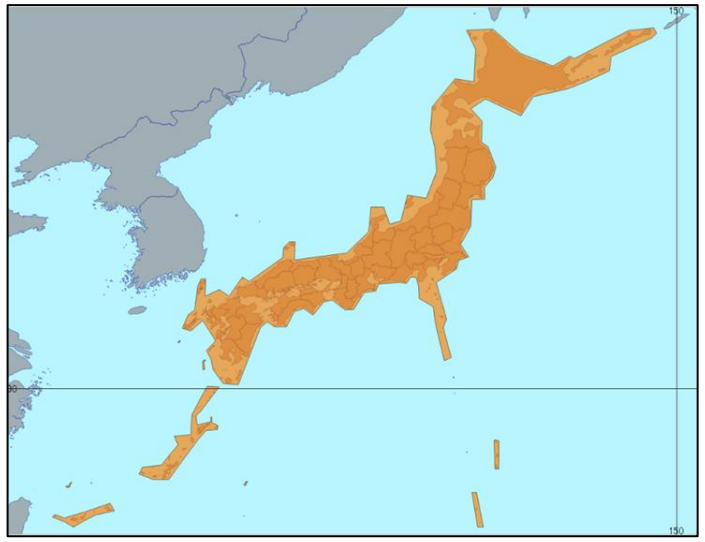

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

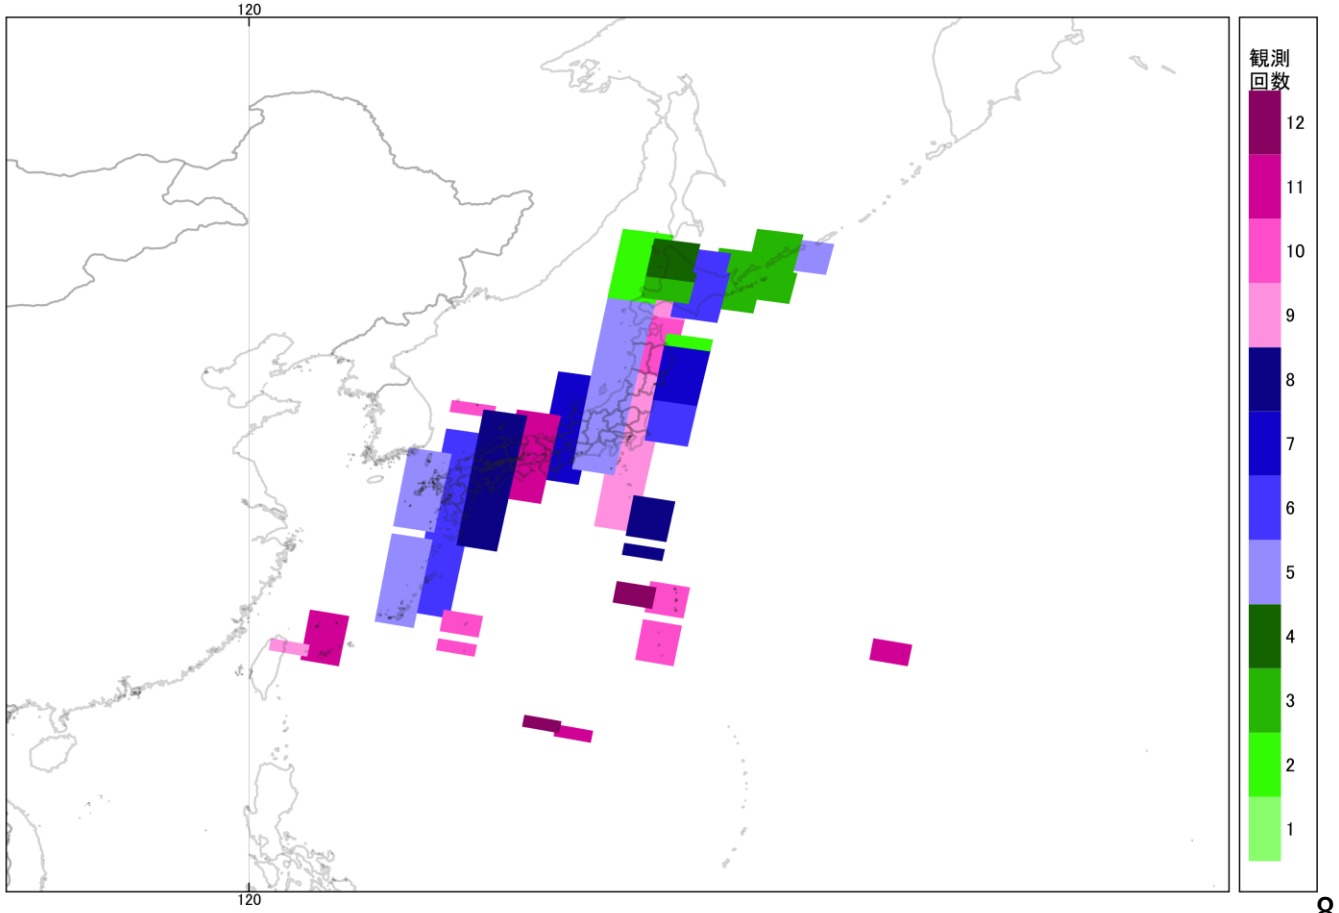

ALOS-4 観測データ取得実績

世界災害ベースマップ（パターンA）（降交軌道（南行）,昇交軌道（北行））

基本観測	観測頻度	分解能	観測モード
世界	2回/年	100m（オフナディア角39.1°）	広域観測（HH+HV/28MHz）

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
–	–	–

【観測エリア】



【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）



ALOS-4 観測データ取得実績

世界災害ベースマップ（パターンB）（降交軌道（南行）,昇交軌道（北行））


基本観測	観測頻度	分解能	観測モード
世界	2回/年	100m（オフナディア角39.1°）	広域観測（HH+HV/28MHz）

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
720	674	93.6%

【観測エリア】



【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

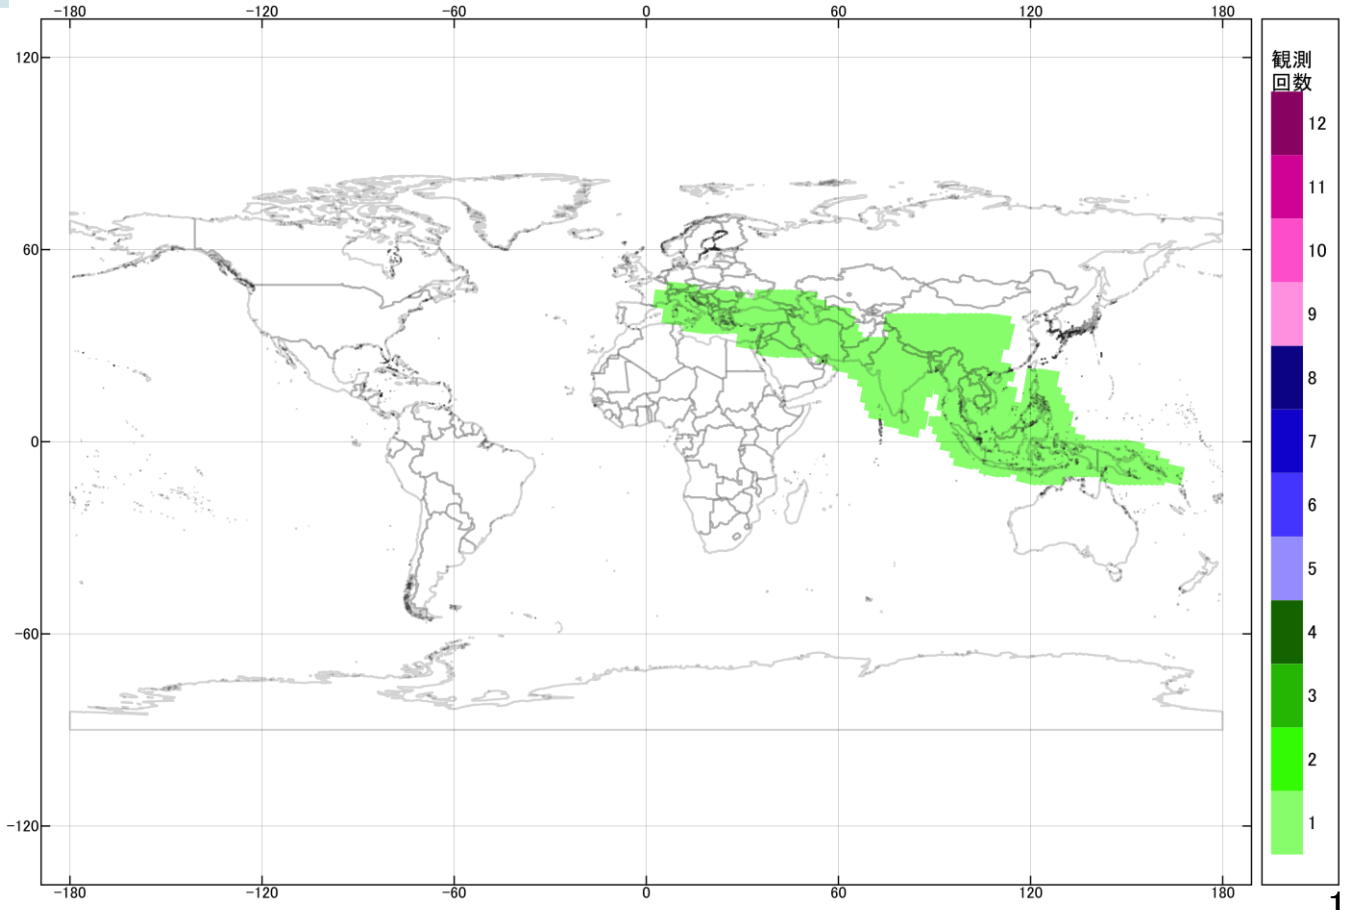


ALOS-4 観測データ取得実績

全球ベースマップ（10m）

基本観測	観測頻度	分解能	観測モード
世界	1回/年	10m/200km幅（オフナディア角32.5°）	高分解能（HH+HV/28MHz）


取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
100,020	75,183	75.2%

【観測エリア】

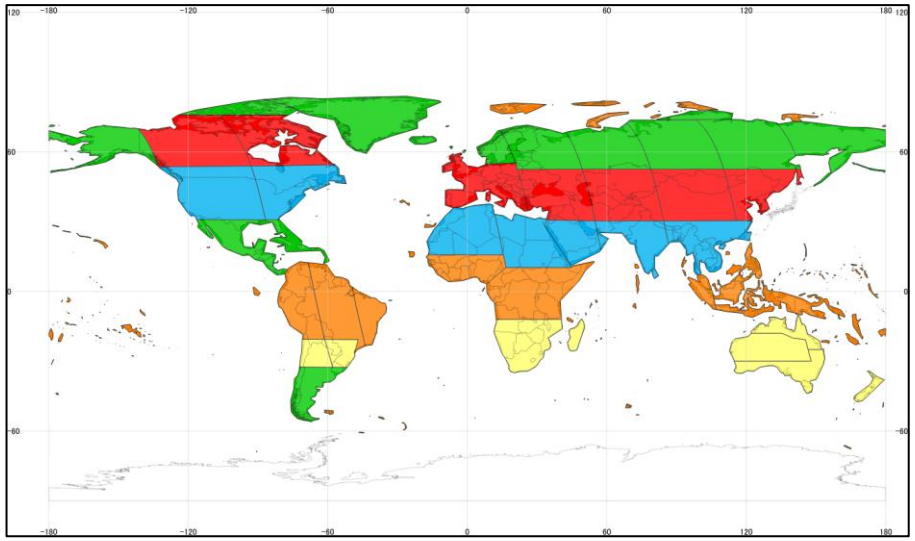

観測エリア：B（赤）、D（オレンジ：パターン1）の観測は集計期間外

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

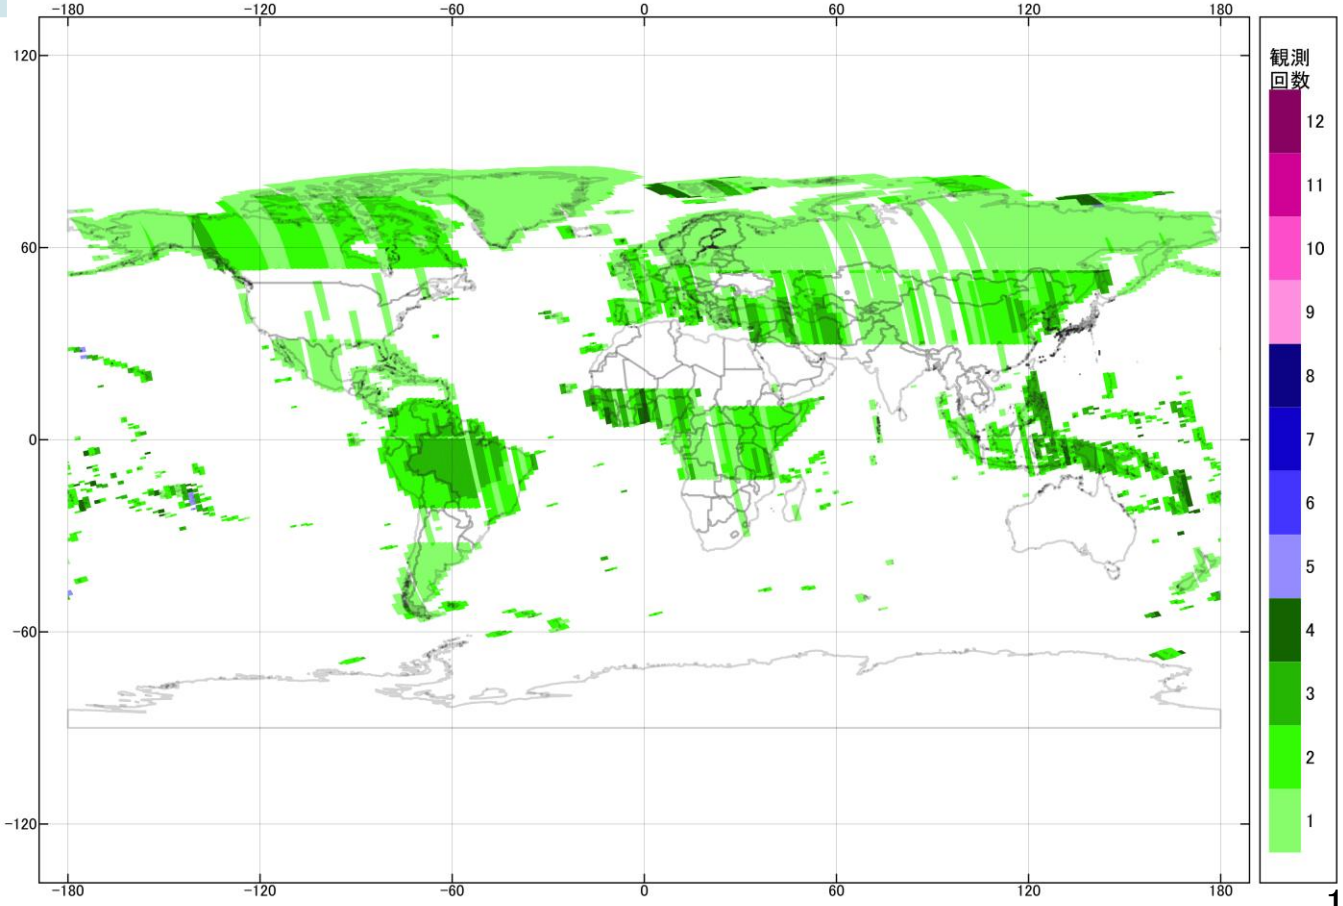


ALOS-4 観測データ取得実績

全球ベースマップ（10m）カテゴリ含む

基本観測	観測頻度	分解能	観測モード
世界	1回/年	10m/200km幅（オフナディア角32.5°）	高分解能（HH+HV/28MHz）


取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
233,511	196,335	84.1%

【観測エリア】

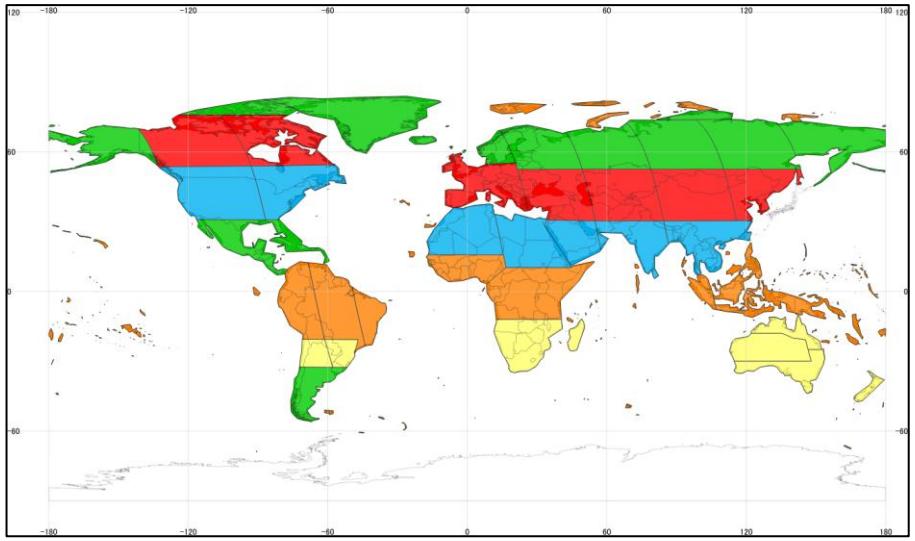

観測エリア：B（赤）、D（オレンジ：パターン1）の観測は集計期間外

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

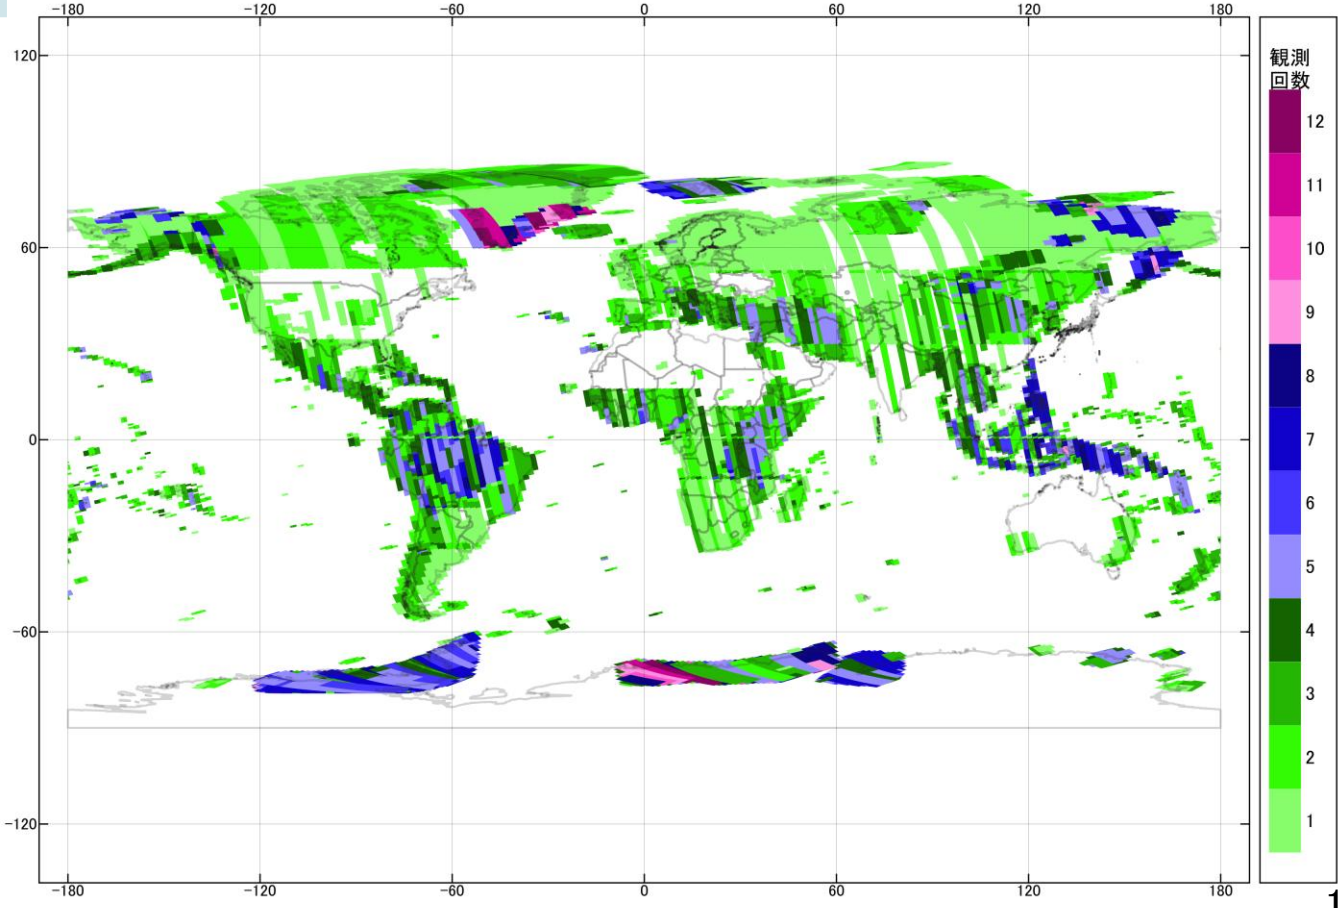

全球ベースマップ：10mで観測した全てのデータを集計


ALOS-4 観測データ取得実績

世界フルポラ（6m）


基本観測	観測頻度	分解能	観測モード
世界	1回/年	6m/100km幅（オフナディア角 30.6° 36.7° ）	高分解能（HH+HV/28MHz）

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
47,834	41,778	87.3%

【観測エリア】

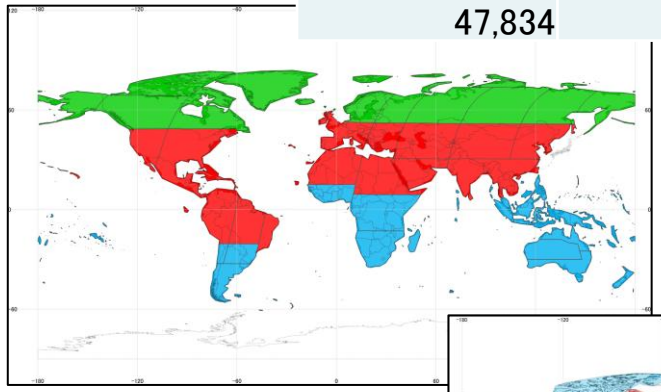


全球ベース6m（2026/04/13まで）

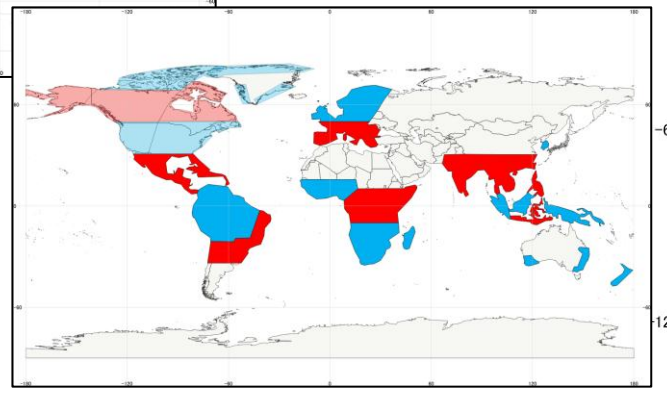

世界フルポラ（2026/4/13～）

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

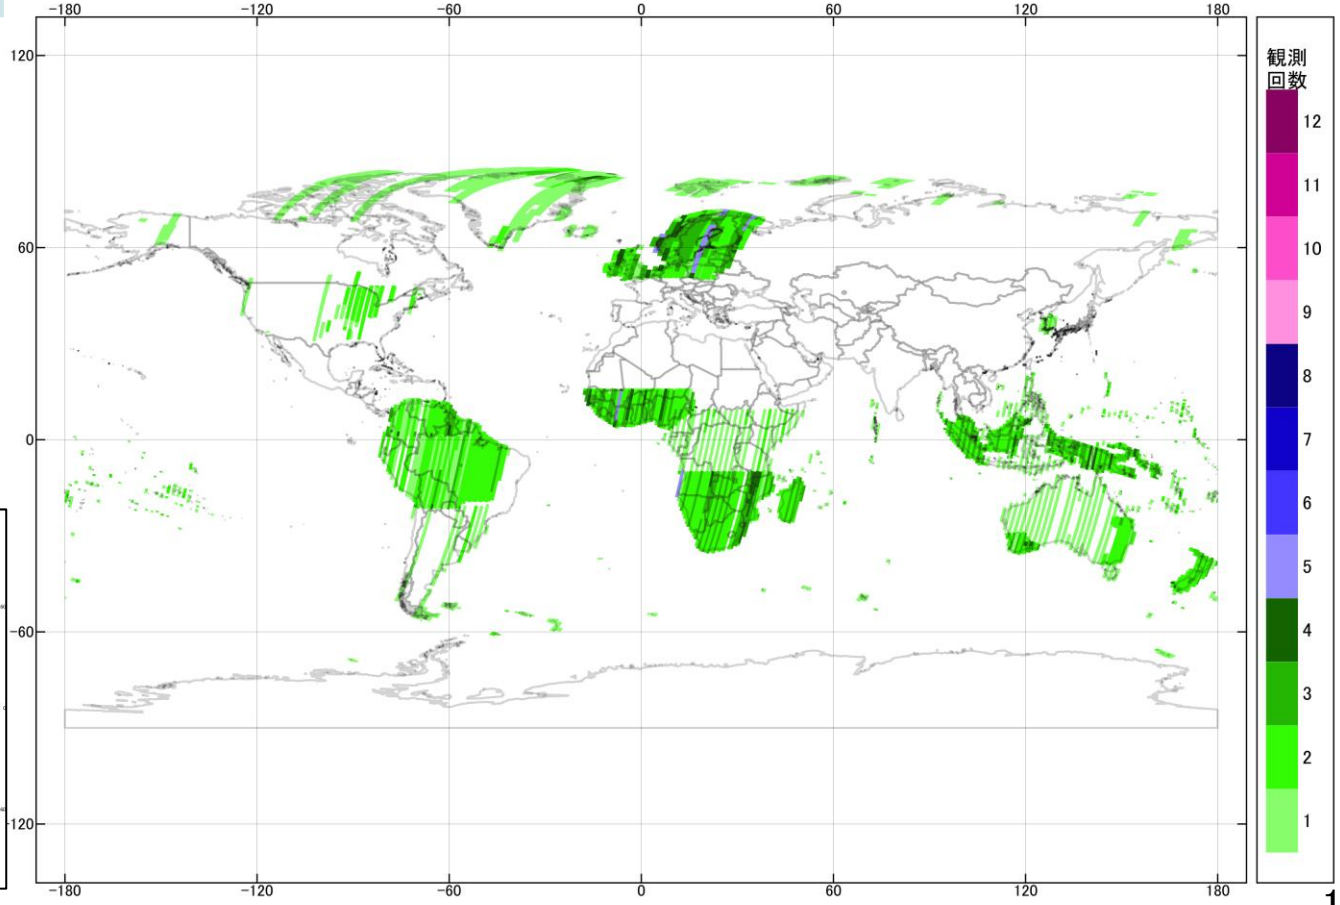


ALOS-4 観測データ取得実績

世界フルポラ（6m）カテゴリ含む


基本観測	観測頻度	分解能	観測モード
世界	1回/年	6m/100km幅（オフナディア角 30.6° 36.7° ）	高分解能（HH+HV/28MHz）

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
60,946	53,546	87.9%

【観測エリア】

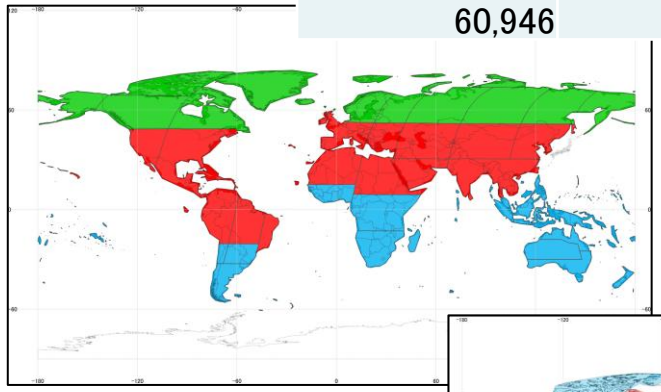


全球ベース6m（2026/04/13まで）

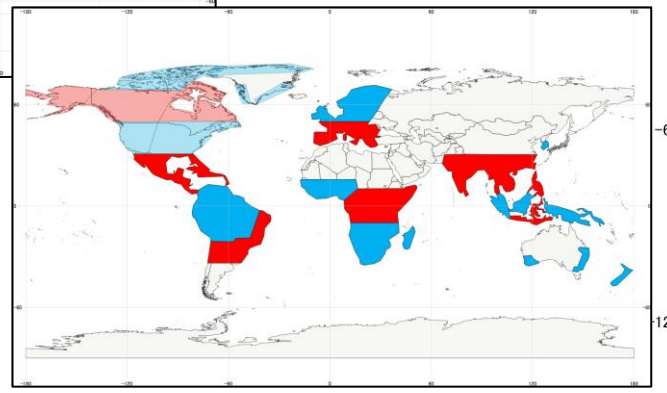

世界フルポラ（2026/4/13～）

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

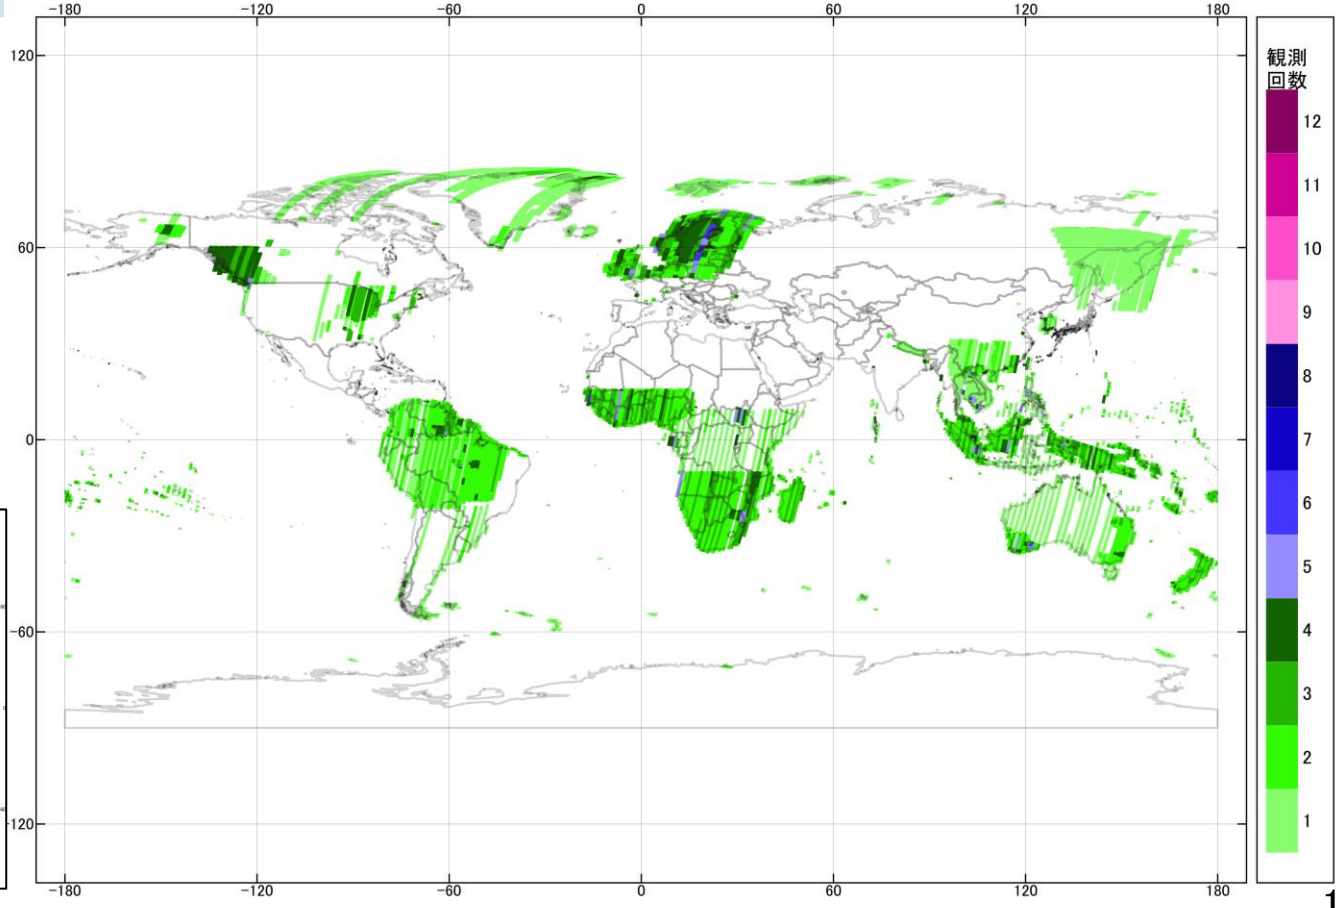

全球ベースマップ：6mで観測した全てのデータを集計

ALOS-4 観測データ取得実績

テーマ別観測モード一覧（１／２）

カテゴリ	観測要求	Asc/Desc	観測頻度	分解能	観測モード
防災	世界重点防災(ALOS-4)	Asc/Desc	年1回	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
海洋	海上風	Asc	回帰毎	広域観測700km幅	広域観測(HH+HV/28MHz)
		Desc	回帰毎	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
湿地	湿地	Asc	通年	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
		Asc	通年	広域観測700km幅	広域観測(HH+HV/28MHz)
	全球マングローブマップ（GMWデータセット）	Desc	年2回	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
	PI要望等	Asc/Desc	通年	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
社会基盤と都市	PI要望等	Asc	通年	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
		Desc	通年	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
森林	森林バイオマス推定	Asc/Desc	年1回	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
	早期伐採検出（JJ-FAST）	Asc	2回帰毎	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
	K&C	Asc	年1回	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
		Desc	年9回	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
	PI要望等	Asc	通年	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
		Desc	通年	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
雪氷	雪氷（ALOS-4 Ice）	Asc	通年	高分解能3m/200km幅	高分解能(HH+HV/84MHz)
			通年	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
			通年	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)

ALOS-4 観測データ取得実績

テーマ別観測モード一覧（２／２）

カテゴリ	観測要求	Asc/Desc	観測頻度	分解能	観測モード
雪氷	雪氷（ALOS-4 Ice）	Desc	通年	高分解能3m/200km幅	高分解能(HH+HV/84MHz)
			通年	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
			通年	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
			通年	広域観測700km幅	広域観測(HH+HV/28MHz)
	PI要望等	Asc	通年	高分解能10m 100km幅/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
		Desc	通年	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
地殻変動と火山	地殻変動（PIXEL含む）	Asc	年10回	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
		Desc	年9回	高分解能3m/200km幅	高分解能(HH+HV/84MHz)
	火山（JAXA）	Asc	年4回	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
	一般要望	Asc/Desc	通年	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
	PI要望等	Asc	通年	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
		Desc	通年	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
			通年	スポットライトモード	高分解能(HH+HV/84MHz)
農業	水稲監視	Asc	2回帰毎	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)
		Desc	2回帰毎	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
	水田メタン評価	Asc	2回帰毎	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
		Desc	2回帰毎	高分解能6m/100km幅	高分解能(HH+HV+VV+VH/42MHz)
	PI要望等	Asc	通年	高分解能10m/200km幅	高分解能(HH+HV/28MHz)


ALOS-4 観測データ取得実績

防災（昇交軌道（北行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
世界重点防災	年1回	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
2,328	2,084	89.5%

【観測エリア】

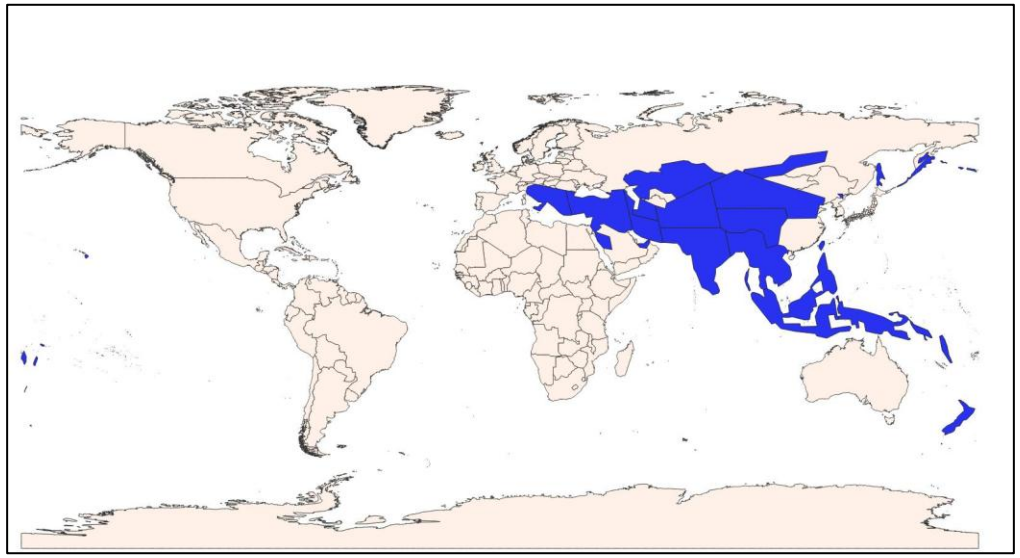

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

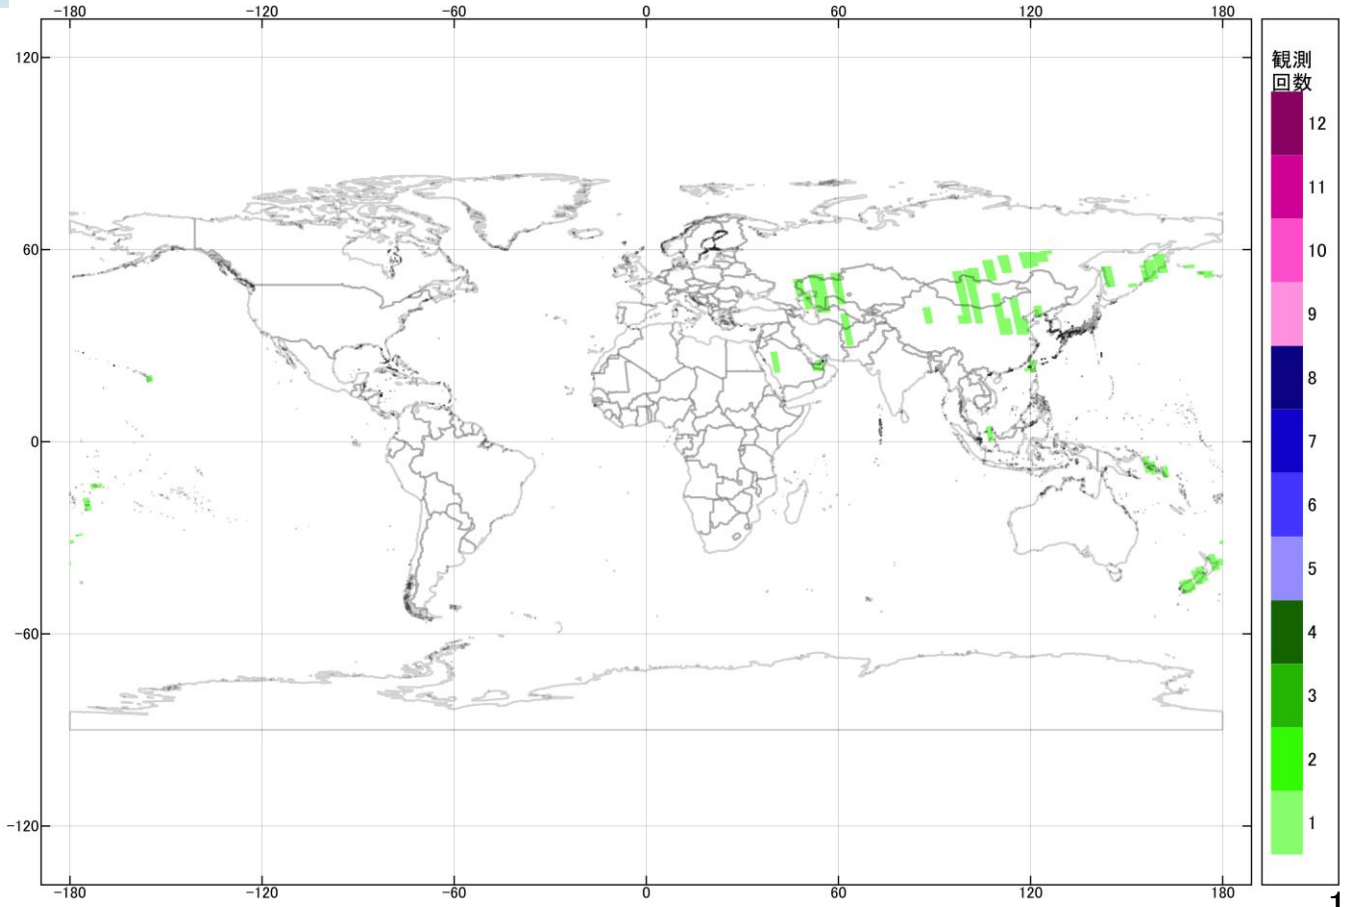


ALOS-4 観測データ取得実績

防災（降交軌道（南行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
世界重点防災	年1回	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
5,031	4,707	93.6%

【観測エリア】

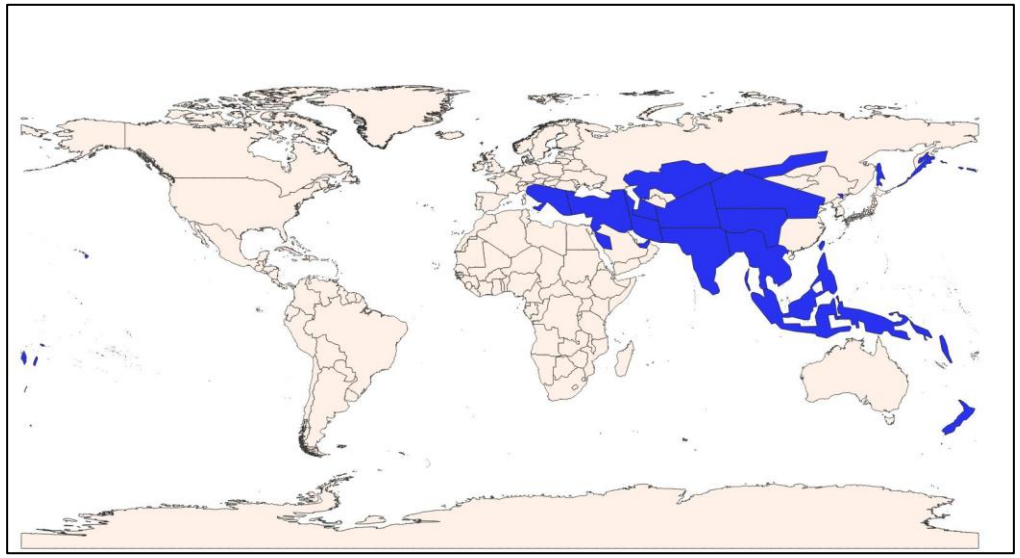

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

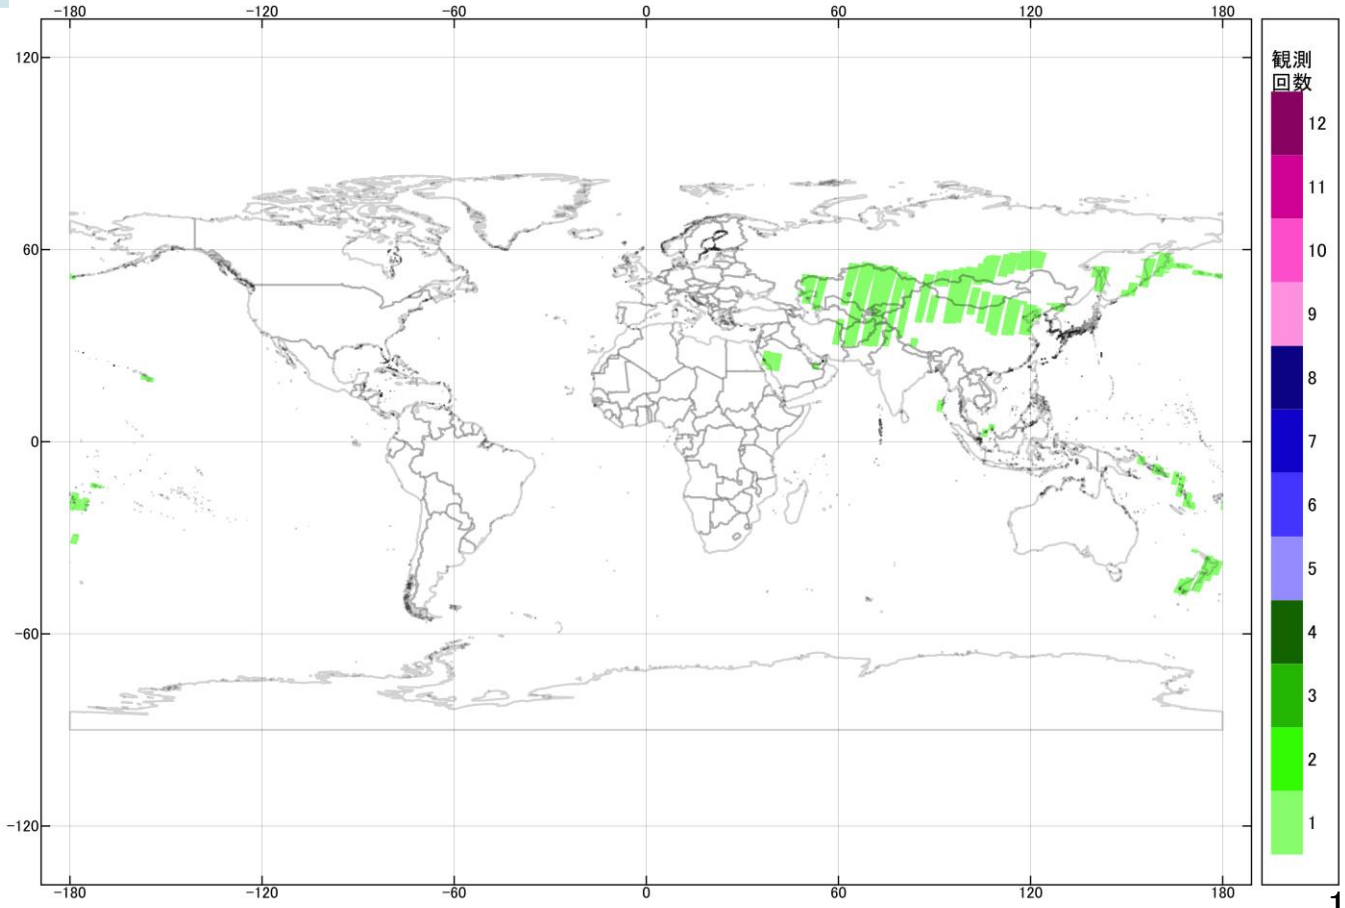


ALOS-4 観測データ取得実績

海洋（昇交軌道（北行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
海上風	回帰毎	広域観測700km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
18	18	100.0%

【観測エリア】

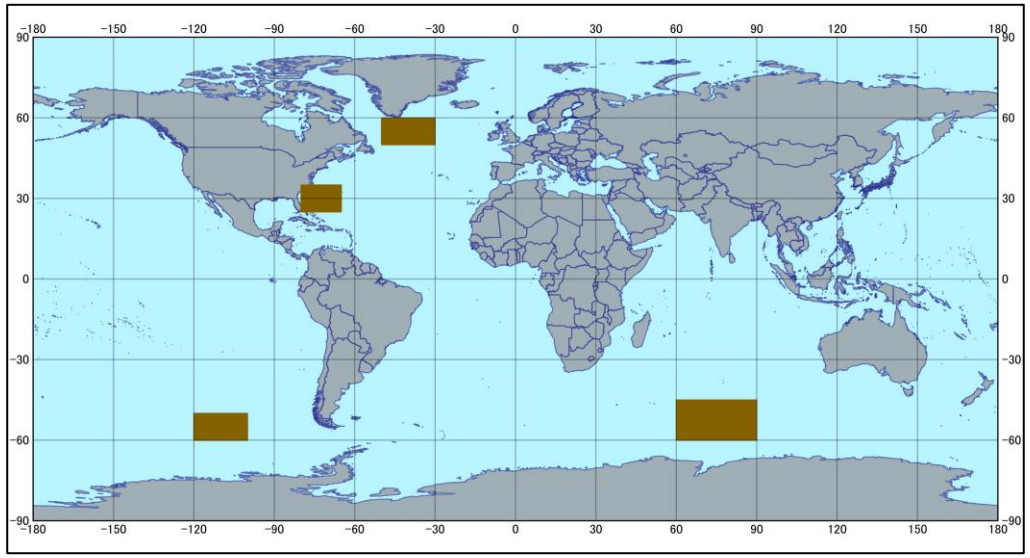

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

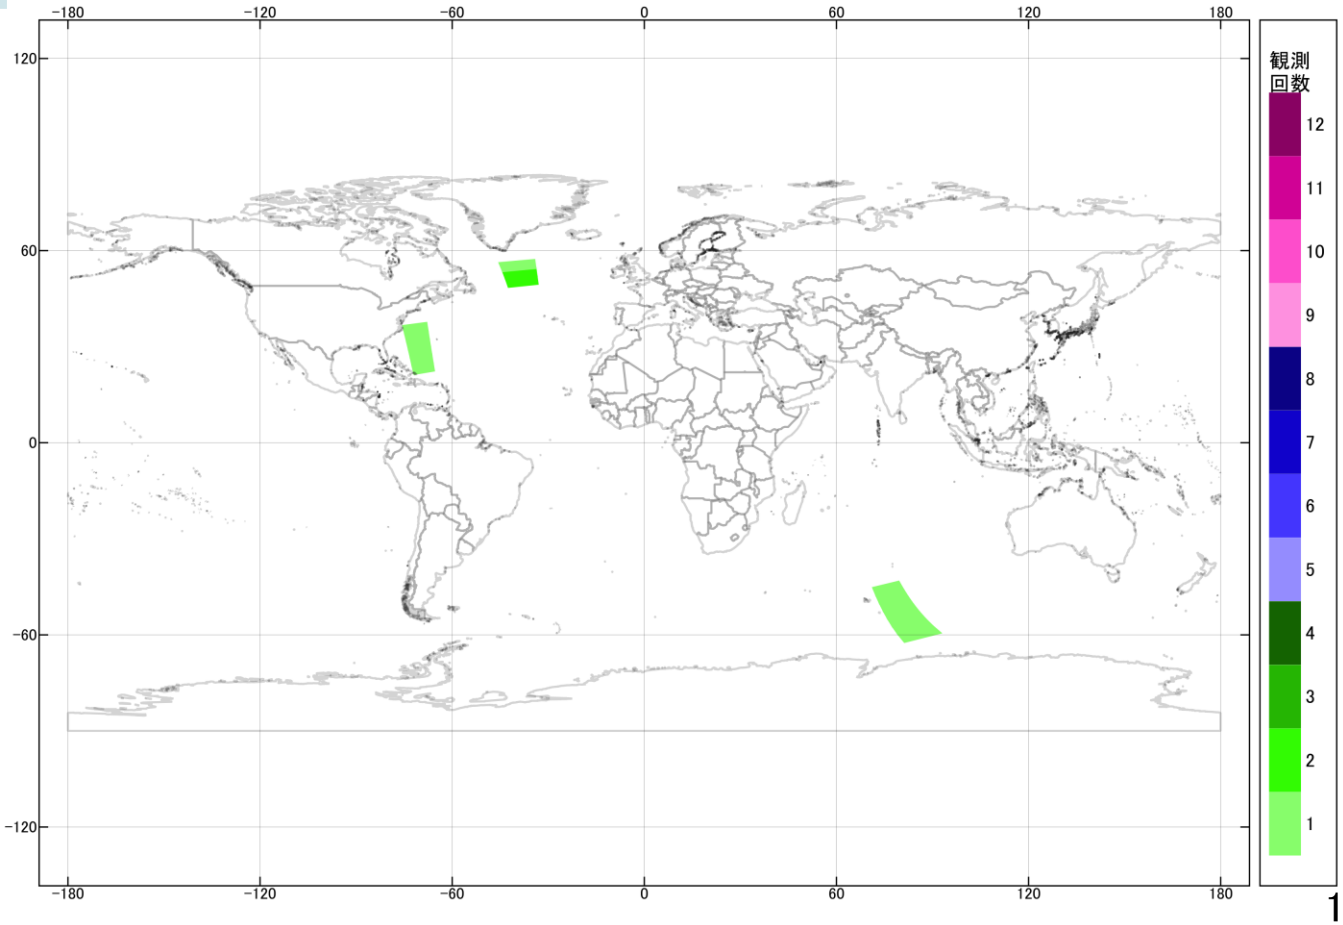


ALOS-4 観測データ取得実績

海洋（降交軌道（南行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
海上風	回帰毎	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
704	704	100.0%

【観測エリア】

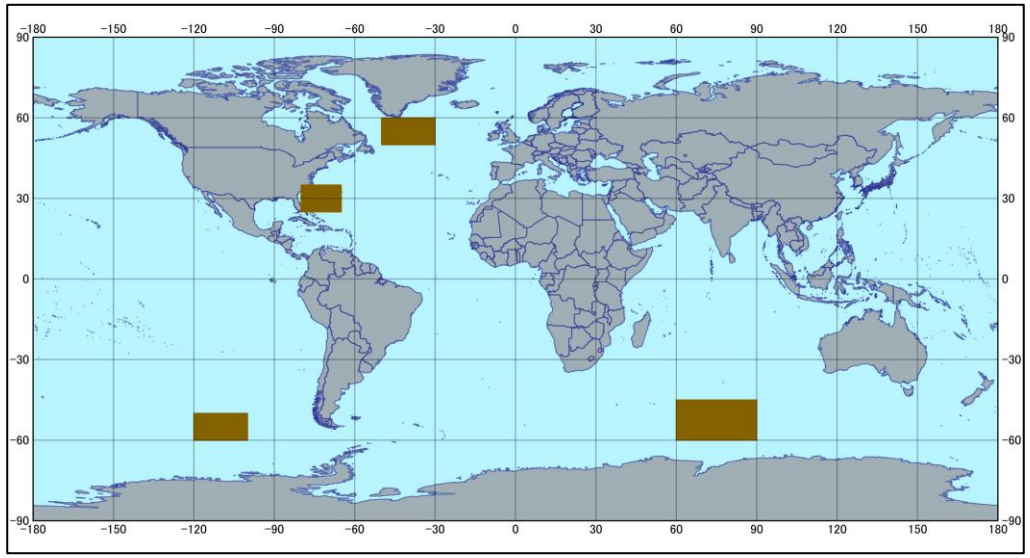

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

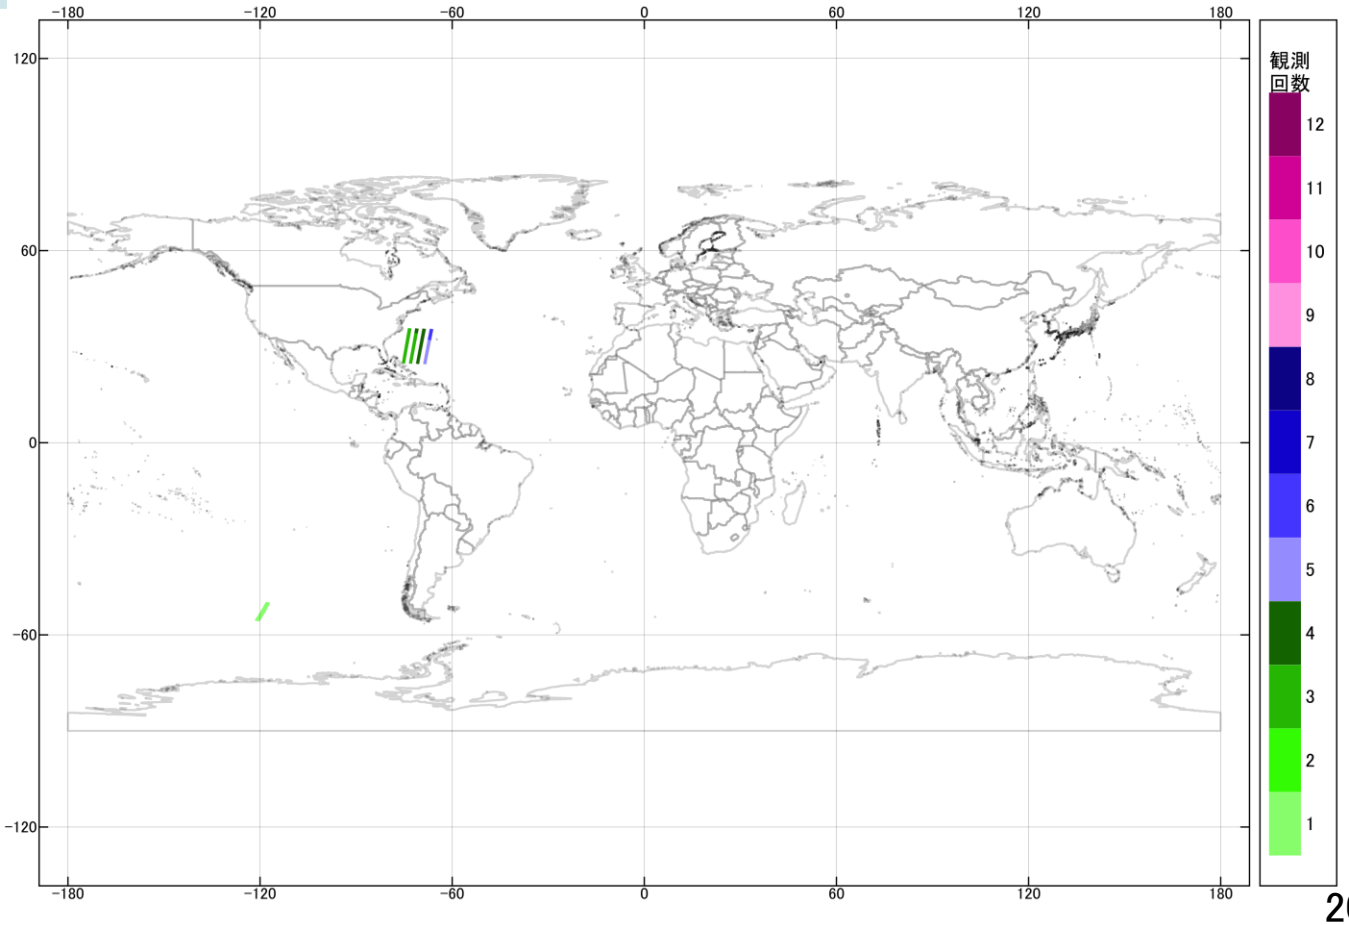


ALOS-4 観測データ取得実績


湿地（昇交軌道（北行））

テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
湿地	通年	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照
湿地	通年	広域観測700km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照
PI要望等	通年	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照

	取得実績（単位：サブビーム）		
	計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
【観測エリア】	31,086	28,164	90.6%

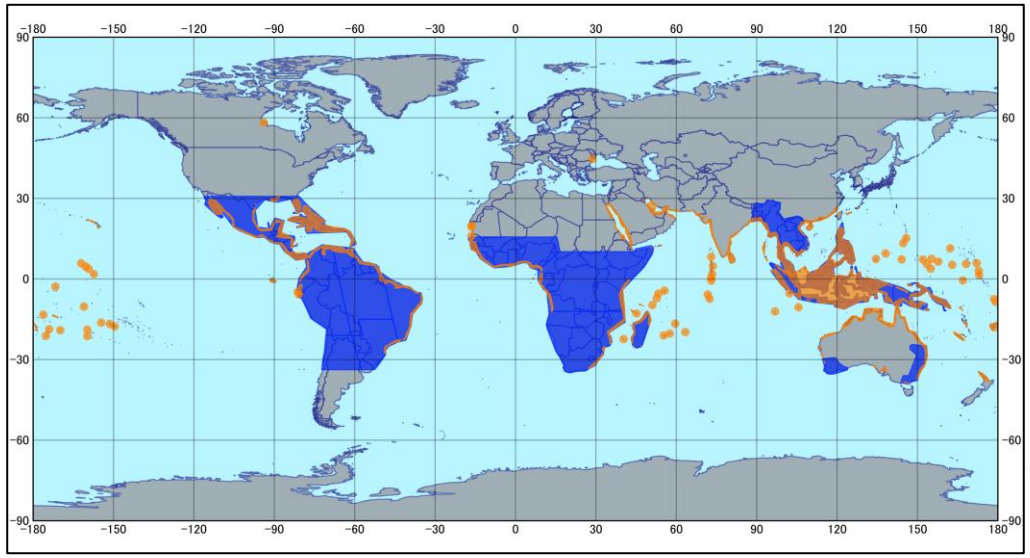

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

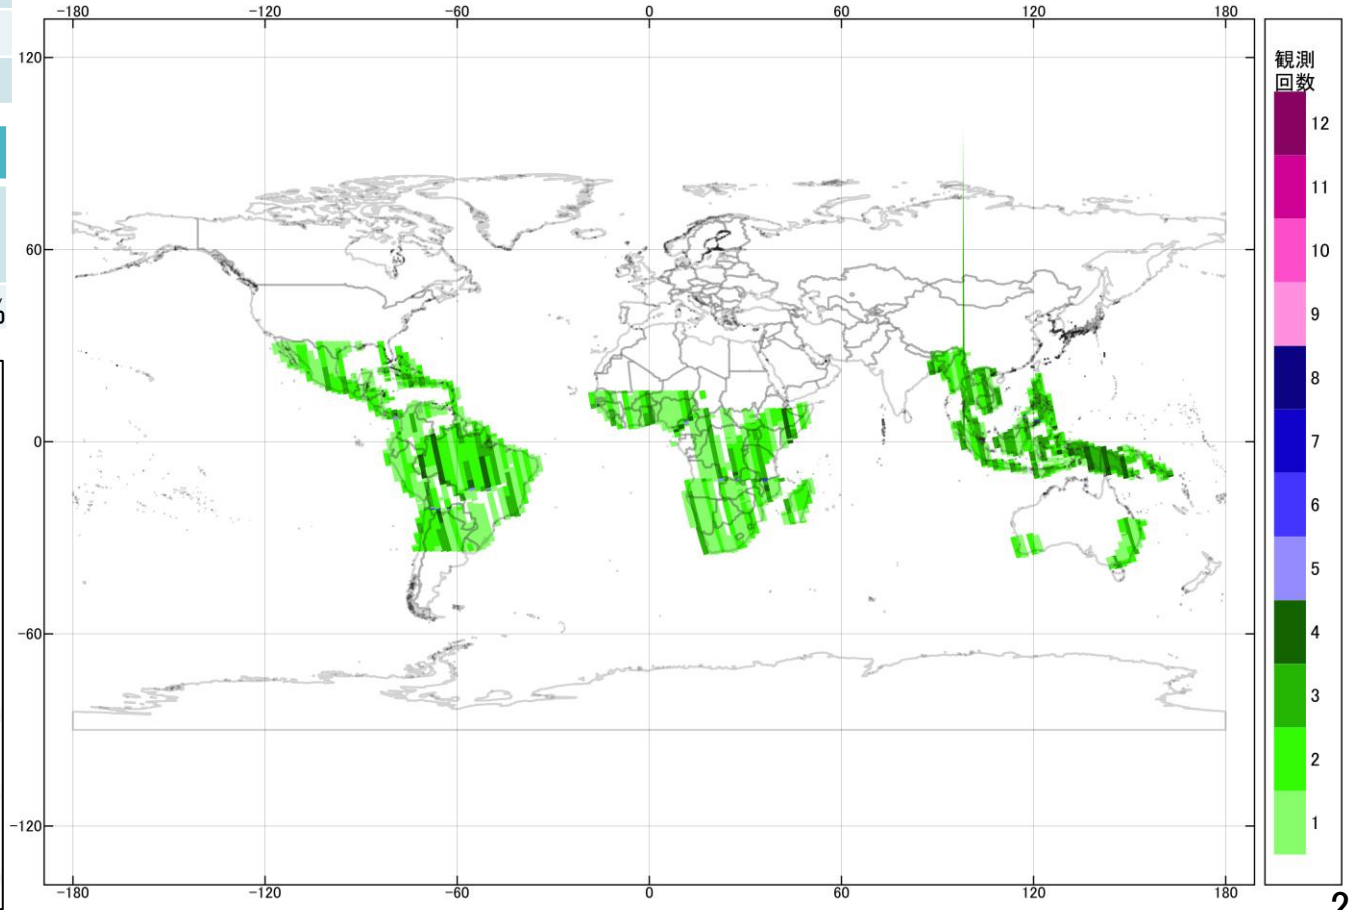


ALOS-4 観測データ取得実績

湿地（降交軌道（南行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
全球マングローブマップ（GMWデータセット）	年2回	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
PI要望等	通年	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
4,144	3,522	85.0%

【観測エリア】

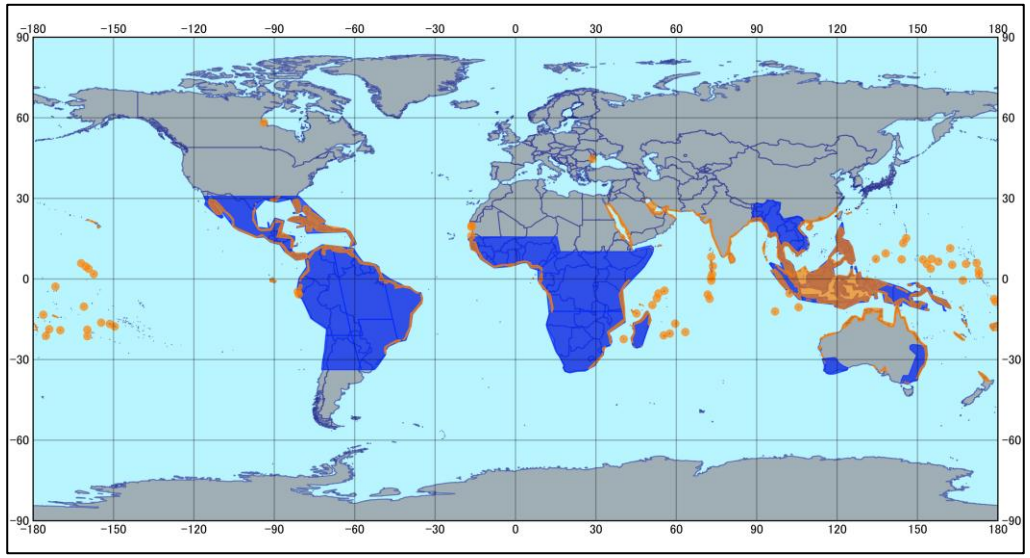

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

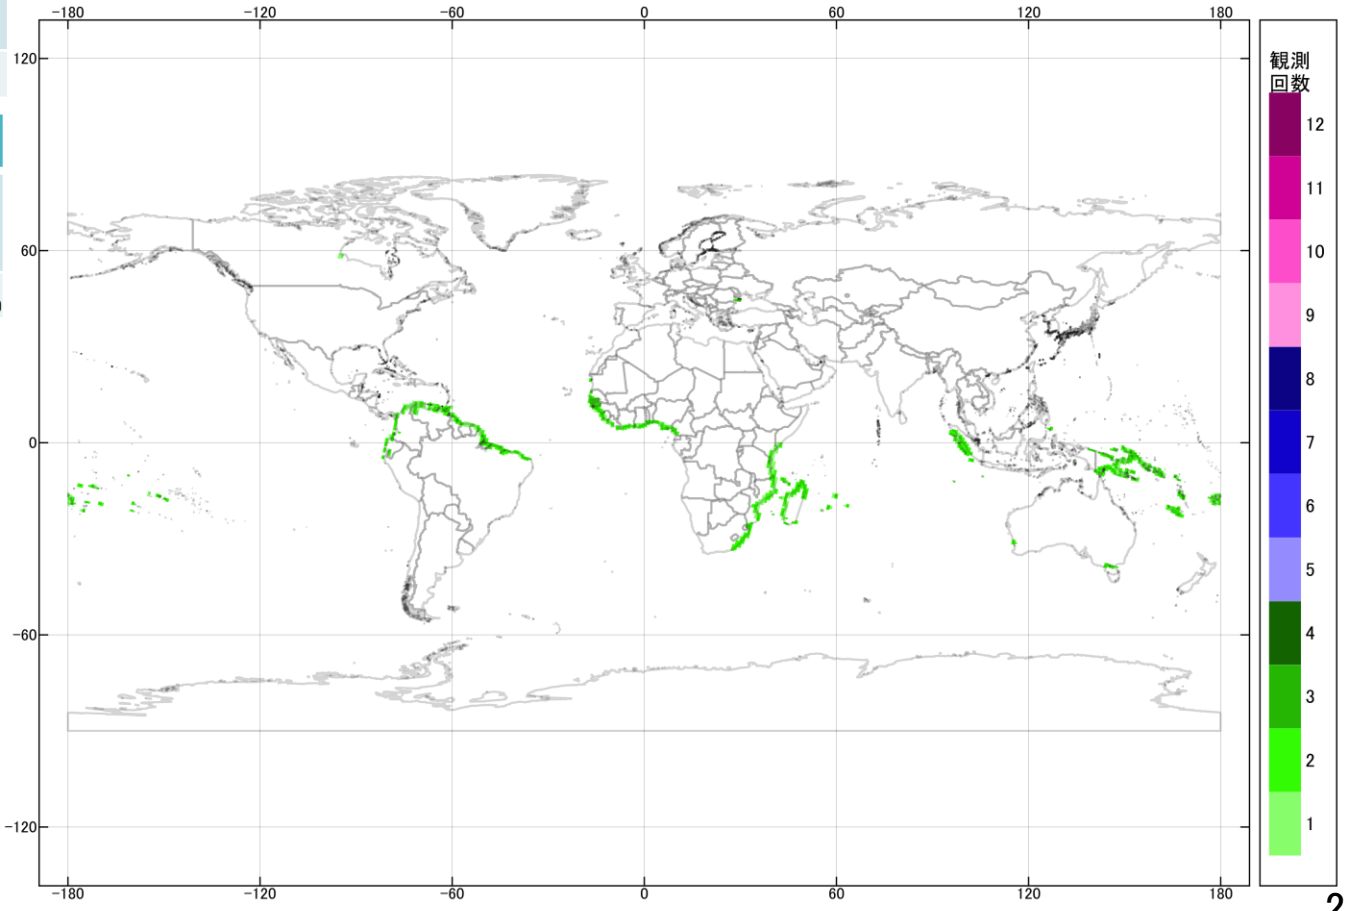


ALOS-4 観測データ取得実績

社会基盤と都市（昇交軌道（北行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
PI要望等	通年	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
120	108	90.0%

【観測エリア】

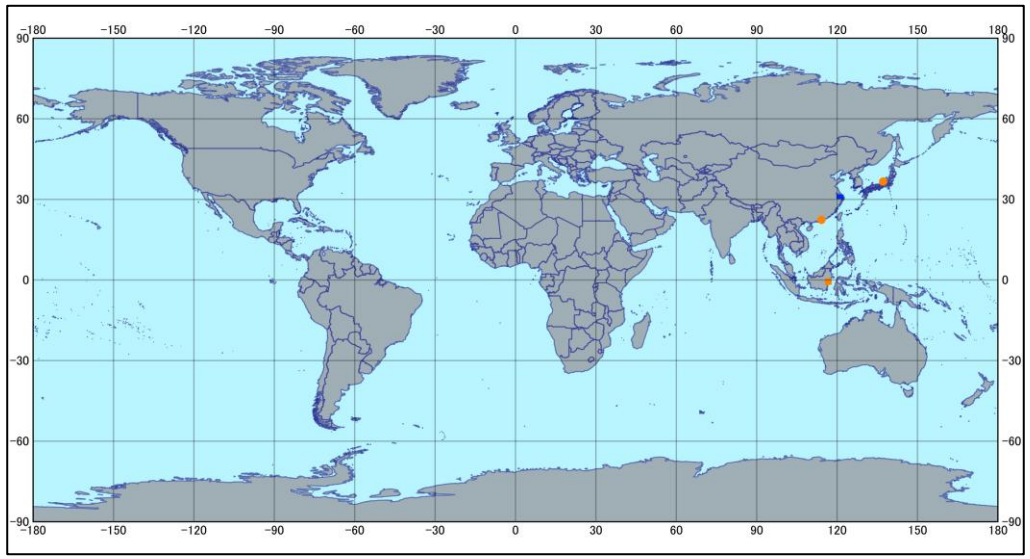

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

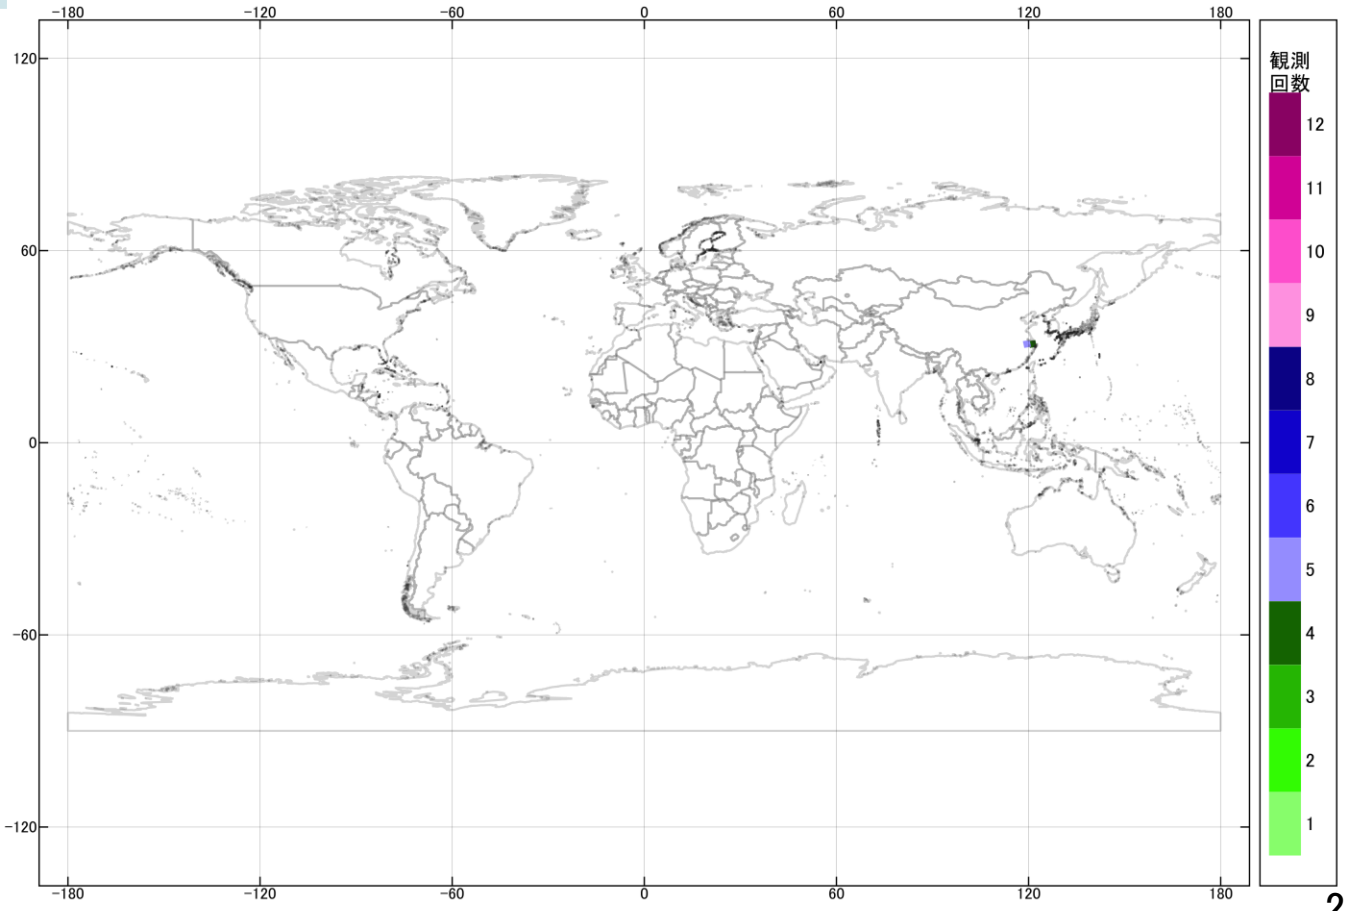


ALOS-4 観測データ取得実績

社会基盤と都市（降交軌道（南行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
PI要望等	通年	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
116	94	81.0%

【観測エリア】

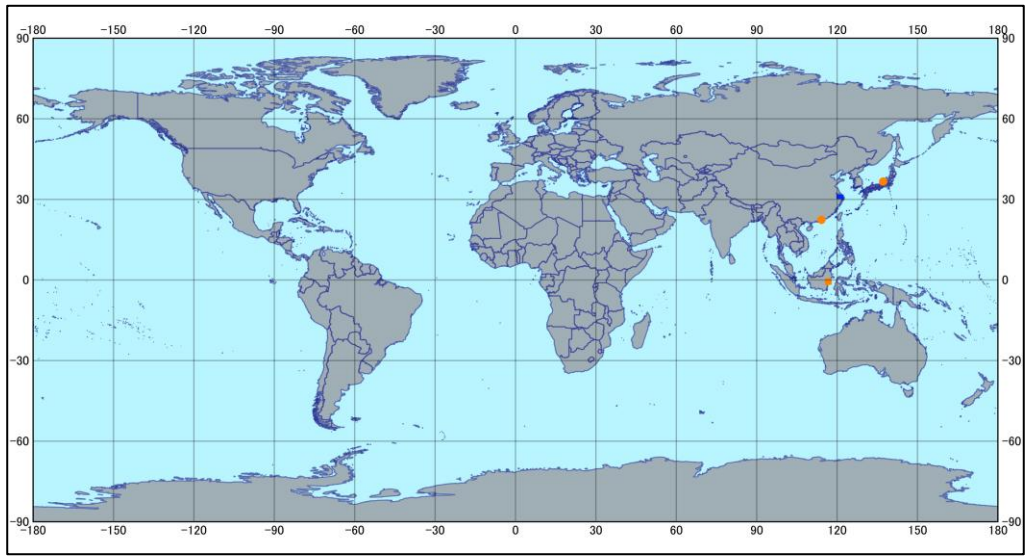

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

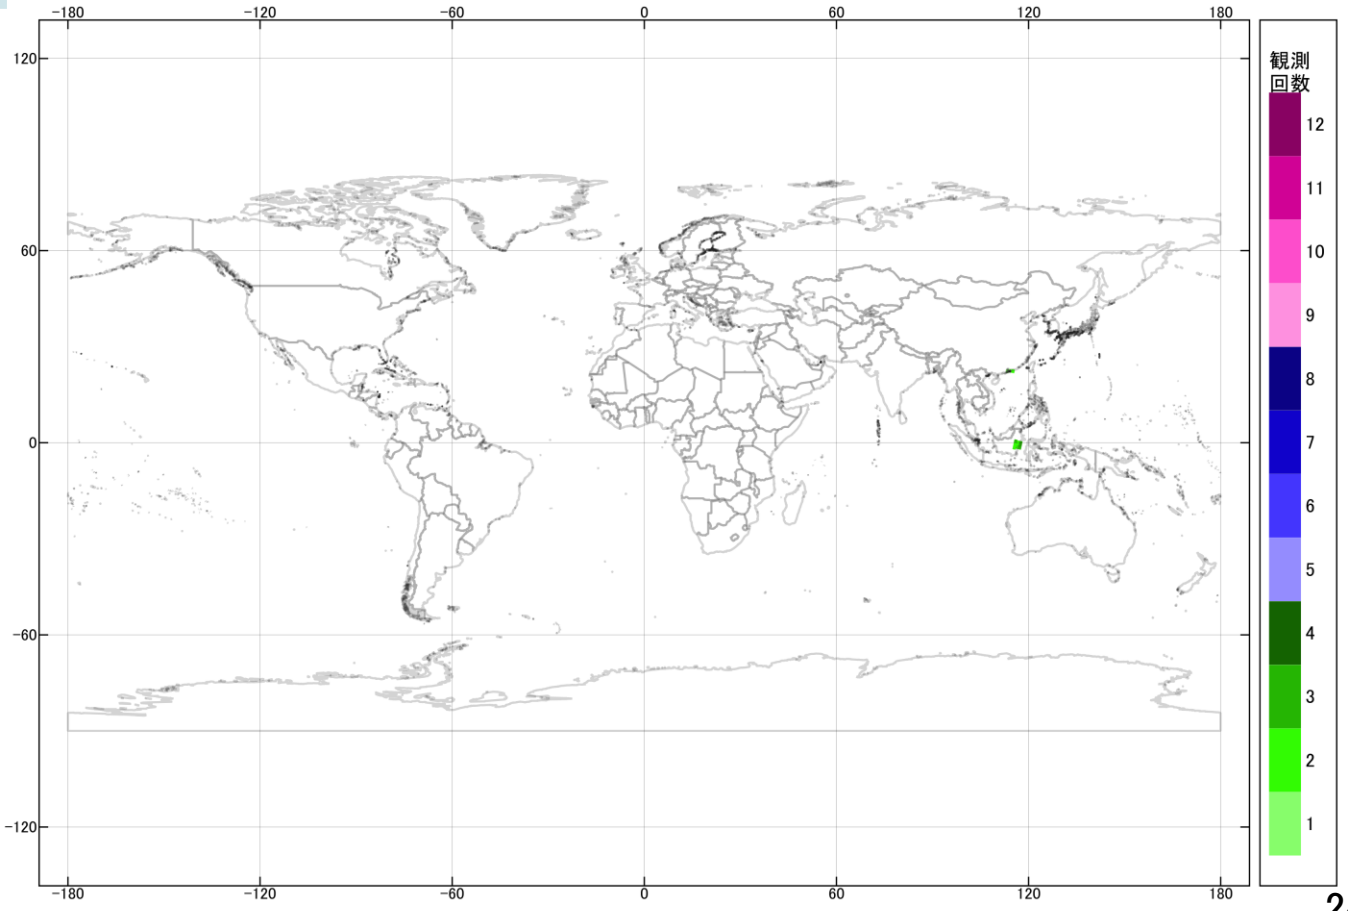


ALOS-4 観測データ取得実績

森林（昇交軌道（北行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
森林バイオマス推定	年1回	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照
早期伐採検出（JJ-FAST）	2回帰毎	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照
K&C	年1回	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照
PI要望等	通年	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
7,708	7,123	92.4%

【観測エリア】

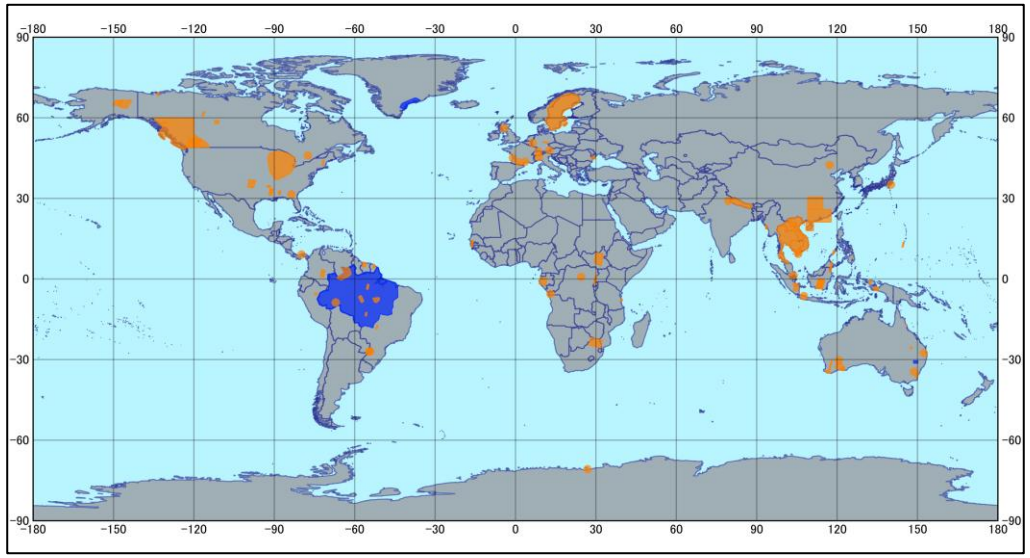

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

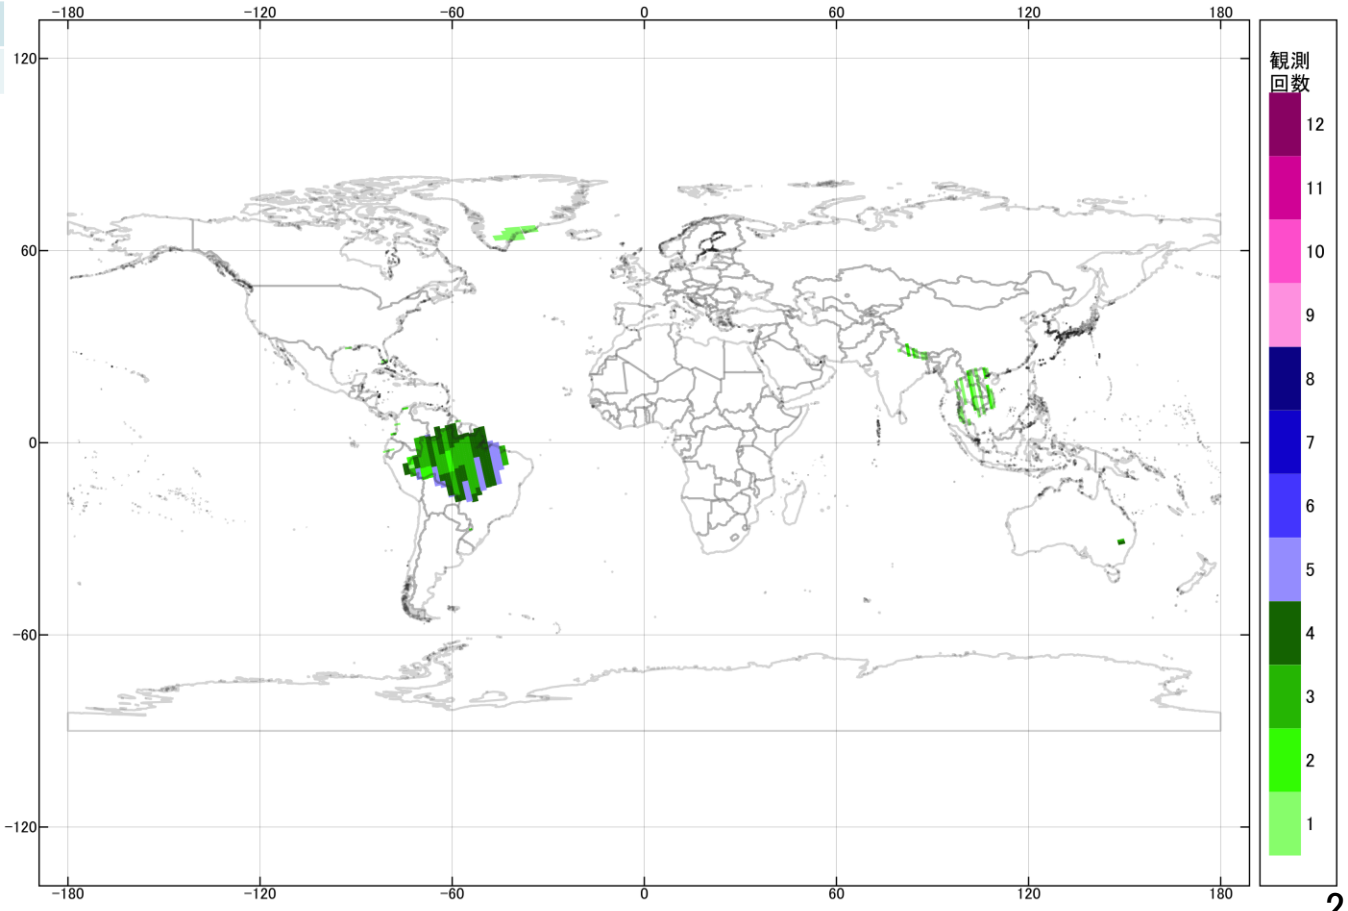


ALOS-4 観測データ取得実績

森林（降交軌道（南行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
森林バイオマス推定	年1回	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
K&C	年9回	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
PI要望等	通年	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
12,096	11,072	91.5%

【観測エリア】

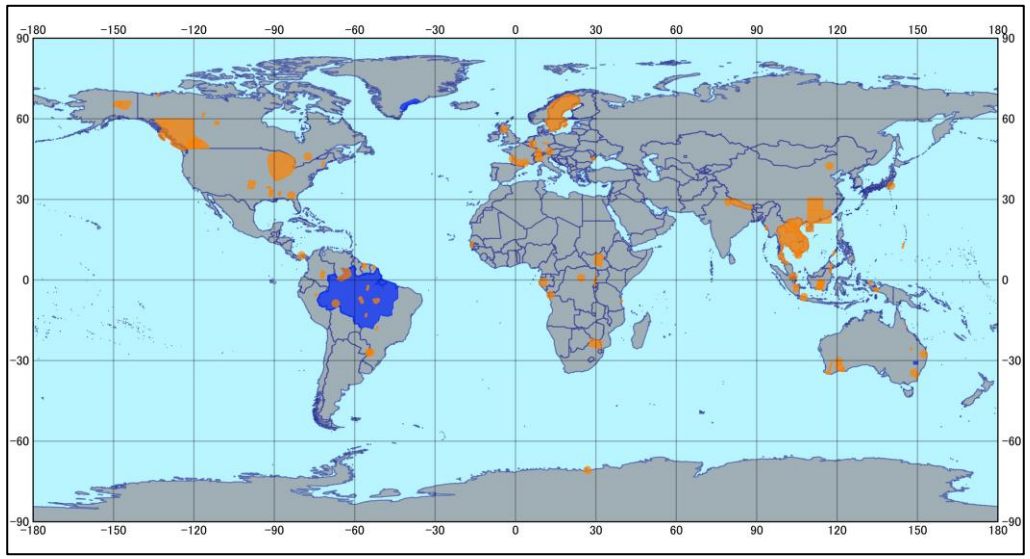

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

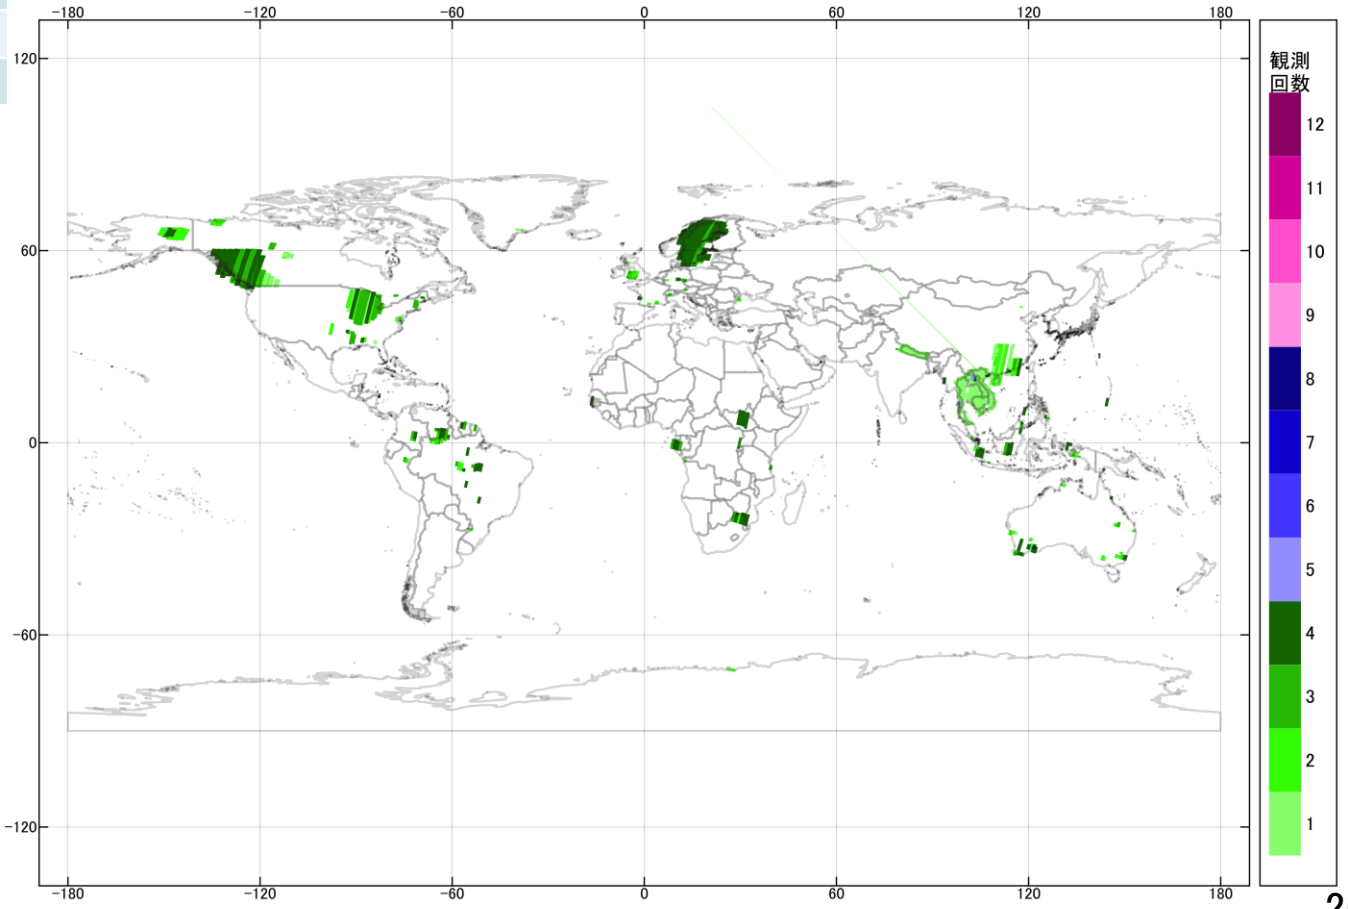


ALOS-4 観測データ取得実績

雪氷（昇交軌道（北行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
雪氷（ALOS-4 Ice）	通年	高分解能3m/200km幅 高分解能6m/100km幅 高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
PI要望等	通年	高分解能10m 100km幅/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
92,753	83,823	90.4%

【観測エリア】

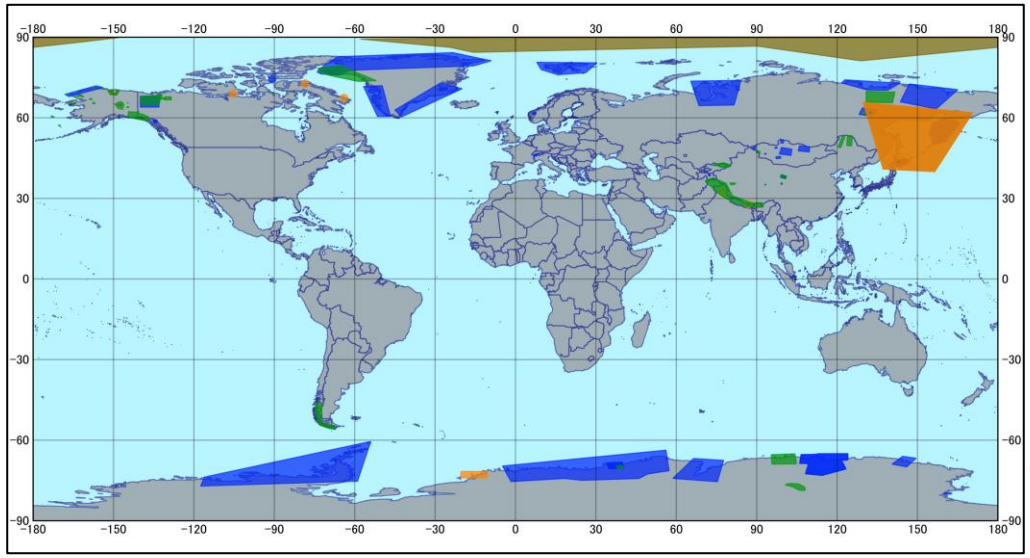

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

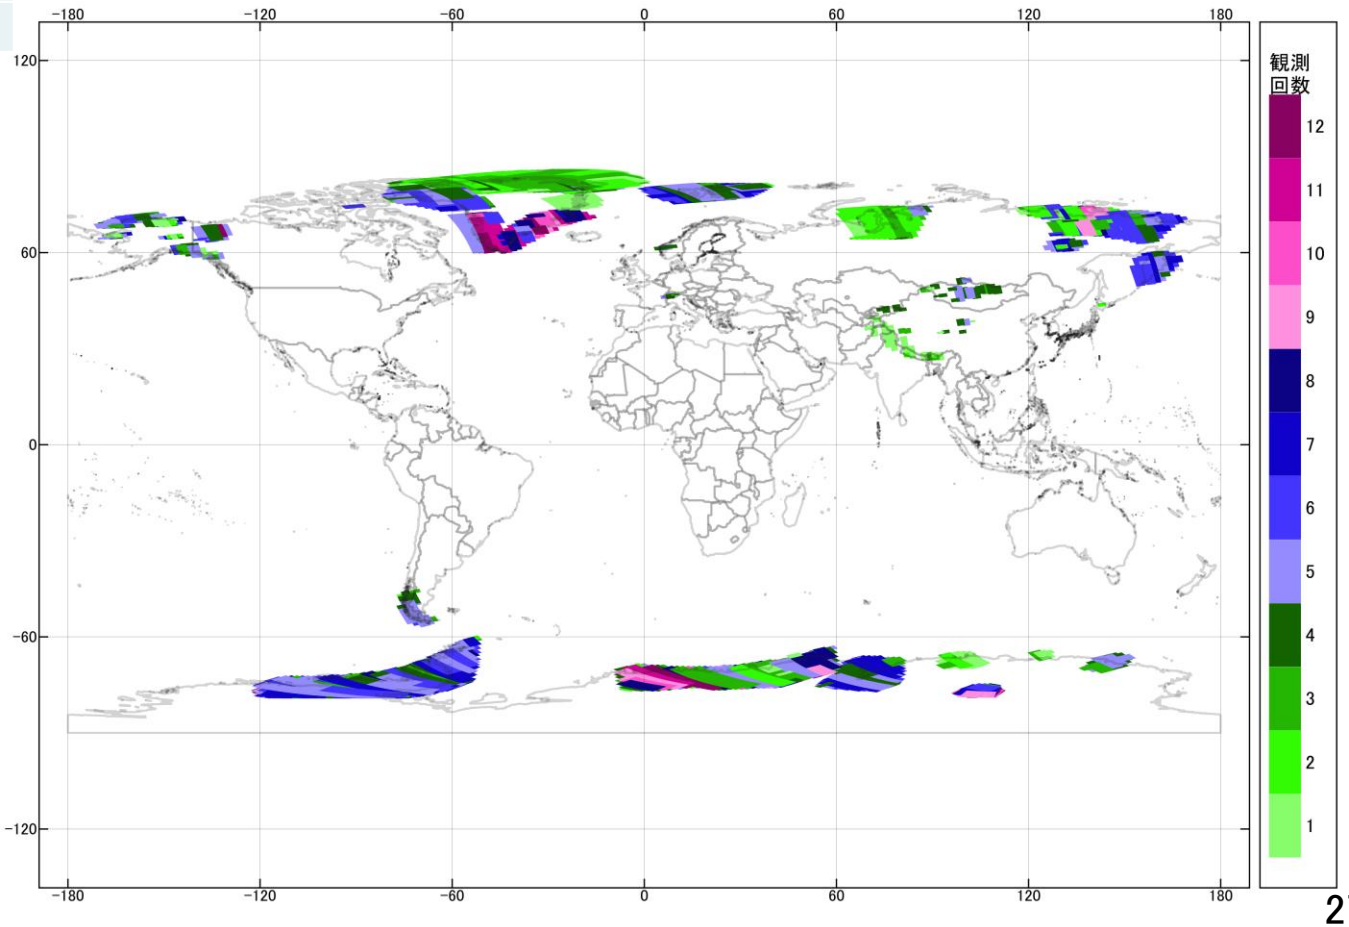


ALOS-4 観測データ取得実績

雪氷（降交軌道（南行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
雪氷（ALOS-4 Ice）	通年	高分解能3m/200km幅 高分解能6m/100km幅 高分解能10m/200km幅 広域観測700km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
PI要望等	通年	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
16,729	14,948	89.4%

【観測エリア】

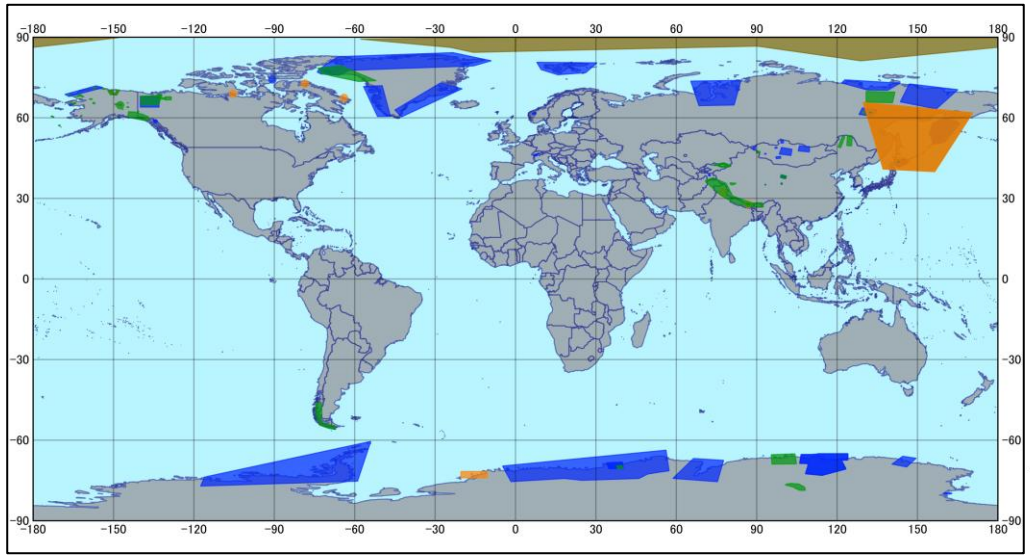

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

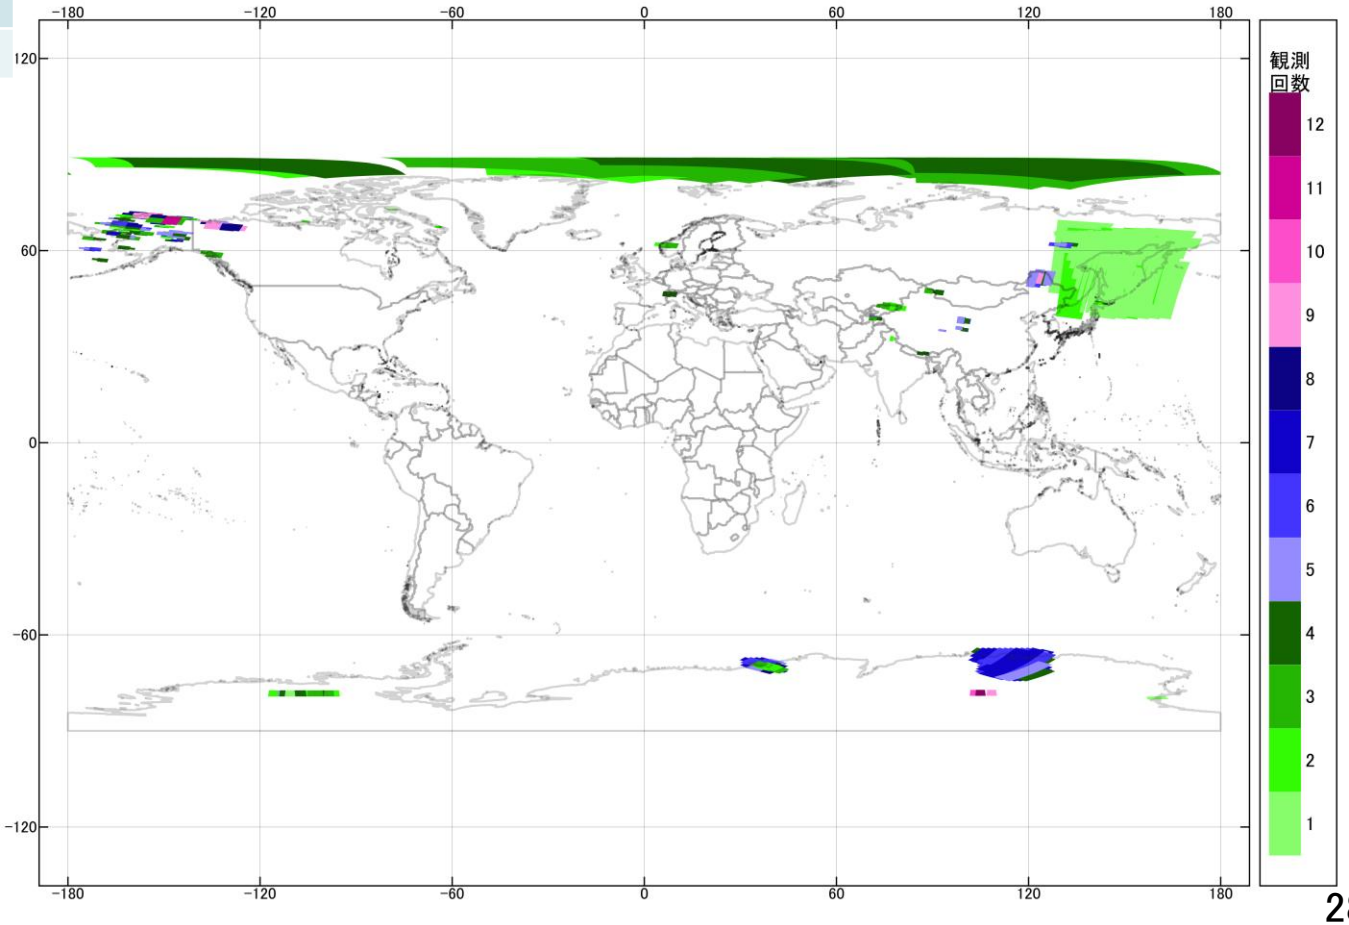


ALOS-4 観測データ取得実績

地殻変動と火山（昇交軌道（北行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
地殻変動（PIXEL含む）	年10回	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
火山（JAXA）	年4回	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
一般要望	通年	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
PI要望等	通年	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
42,859	37,193	86.8%

【観測エリア】

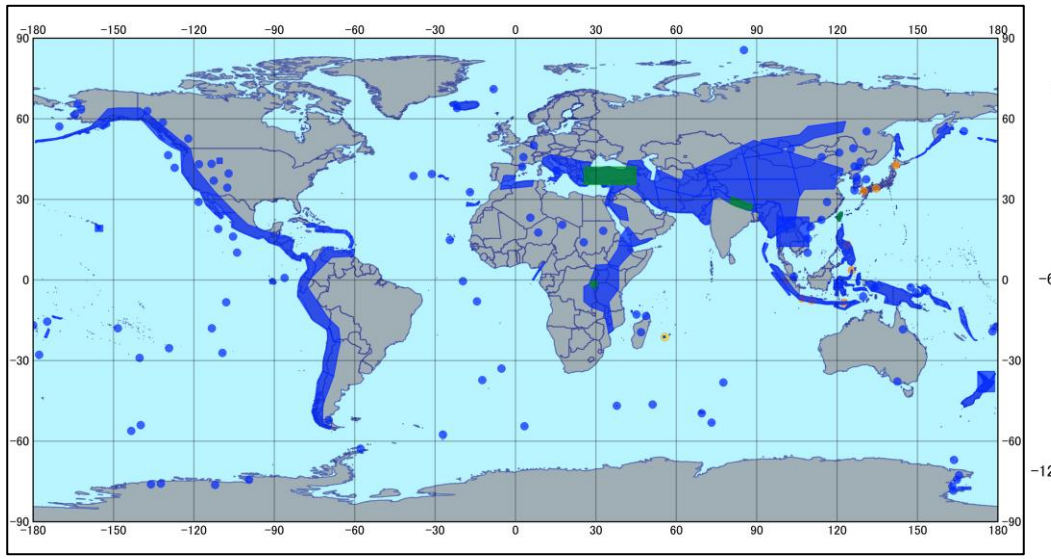

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

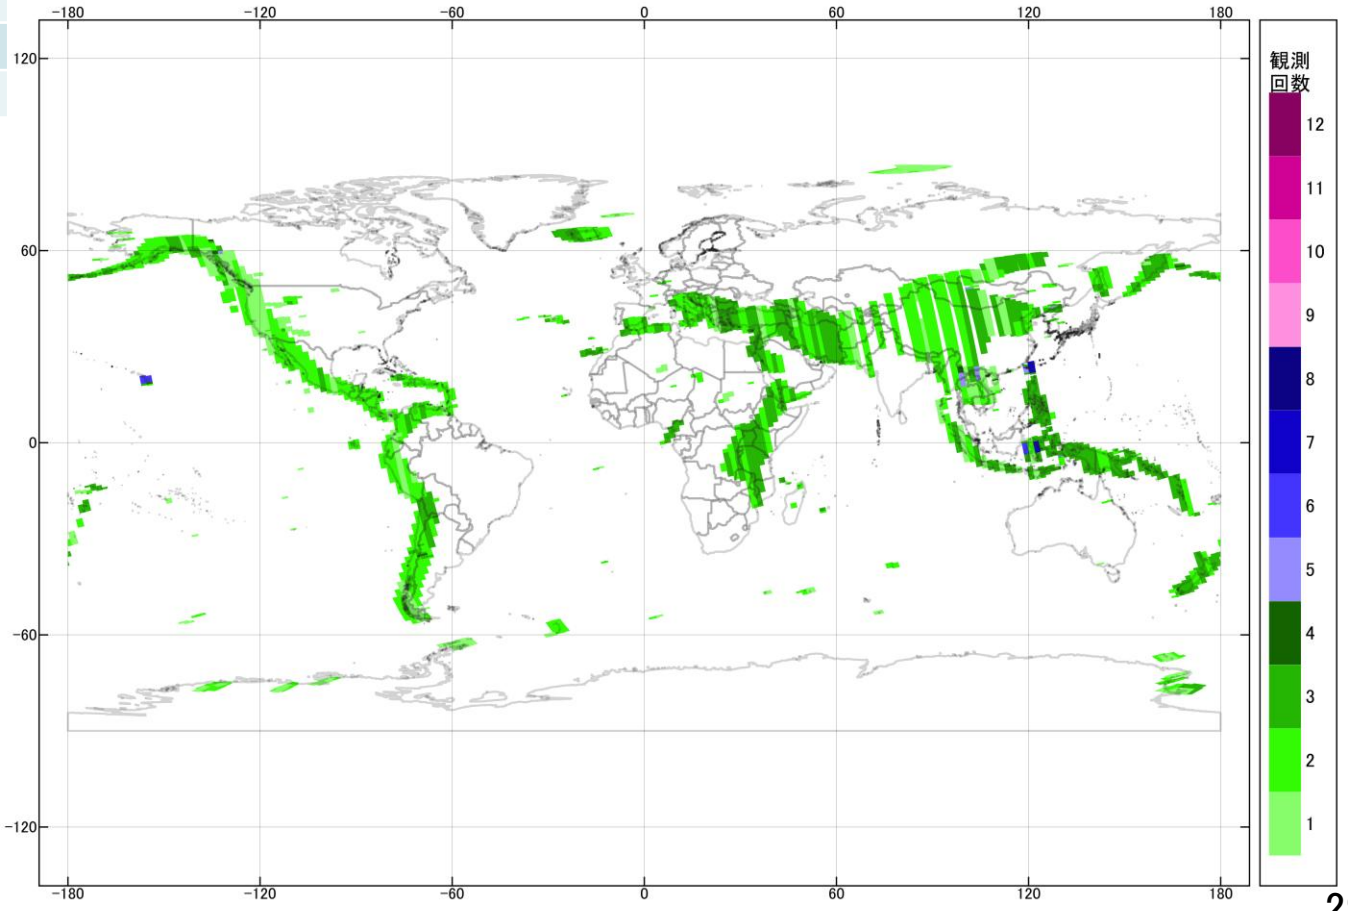


ALOS-4 観測データ取得実績

地殻変動と火山（降交軌道（南行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
地殻変動（PIXEL含む）	年9回	高分解能3m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
一般要望	通年	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
PI要望等	通年	高分解能6m/100km幅 スポットライトモード	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
7,479	6,663	89.1%

【観測エリア】

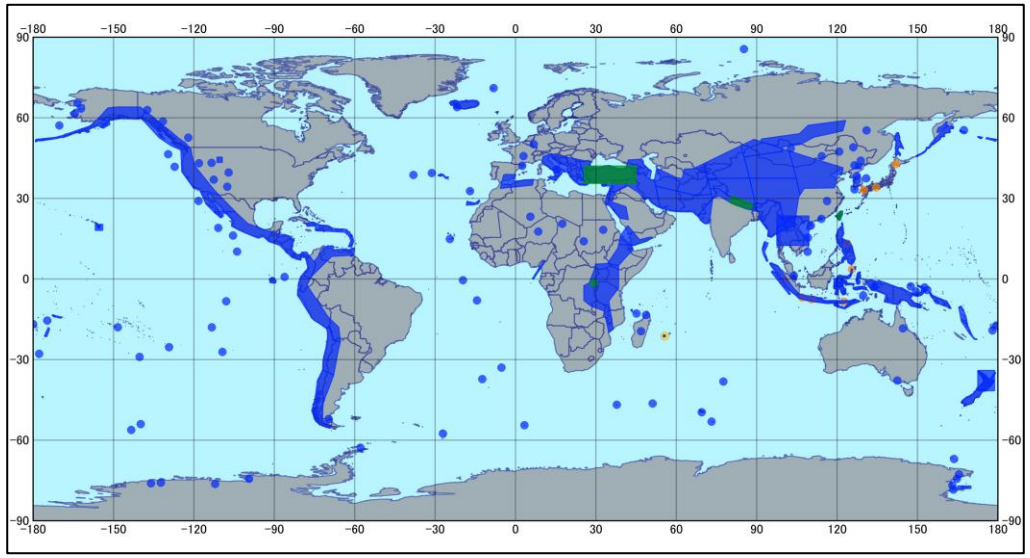

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

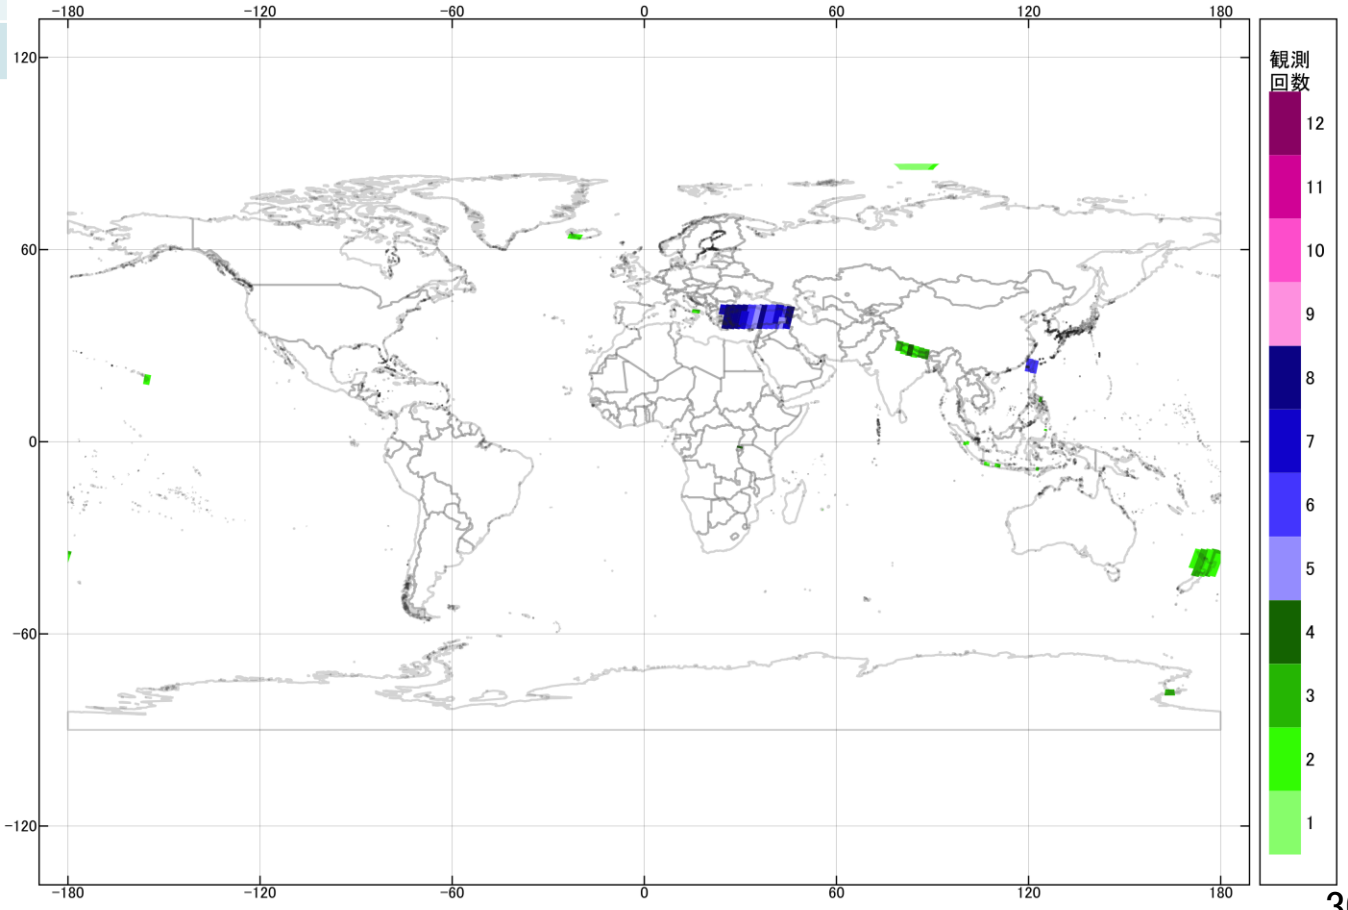


ALOS-4 観測データ取得実績

農業（昇交軌道（北行））


テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
水稲監視	2回帰毎	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
水田メタン評価	2回帰毎	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照
PI要望等	通年	高分解能10m/200km幅	「テーマ別観測モード一覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
11,176	9,852	88.2%

【観測エリア】

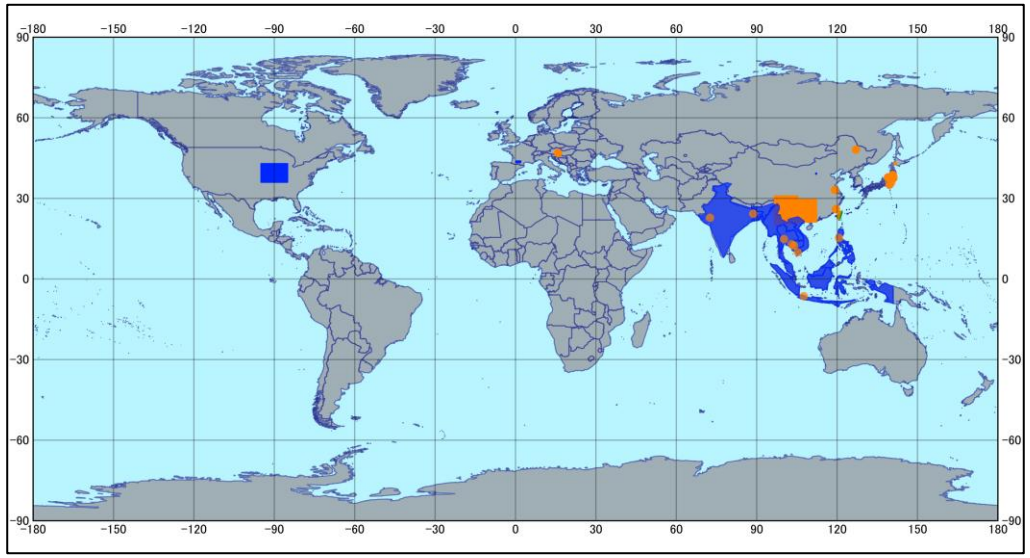

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

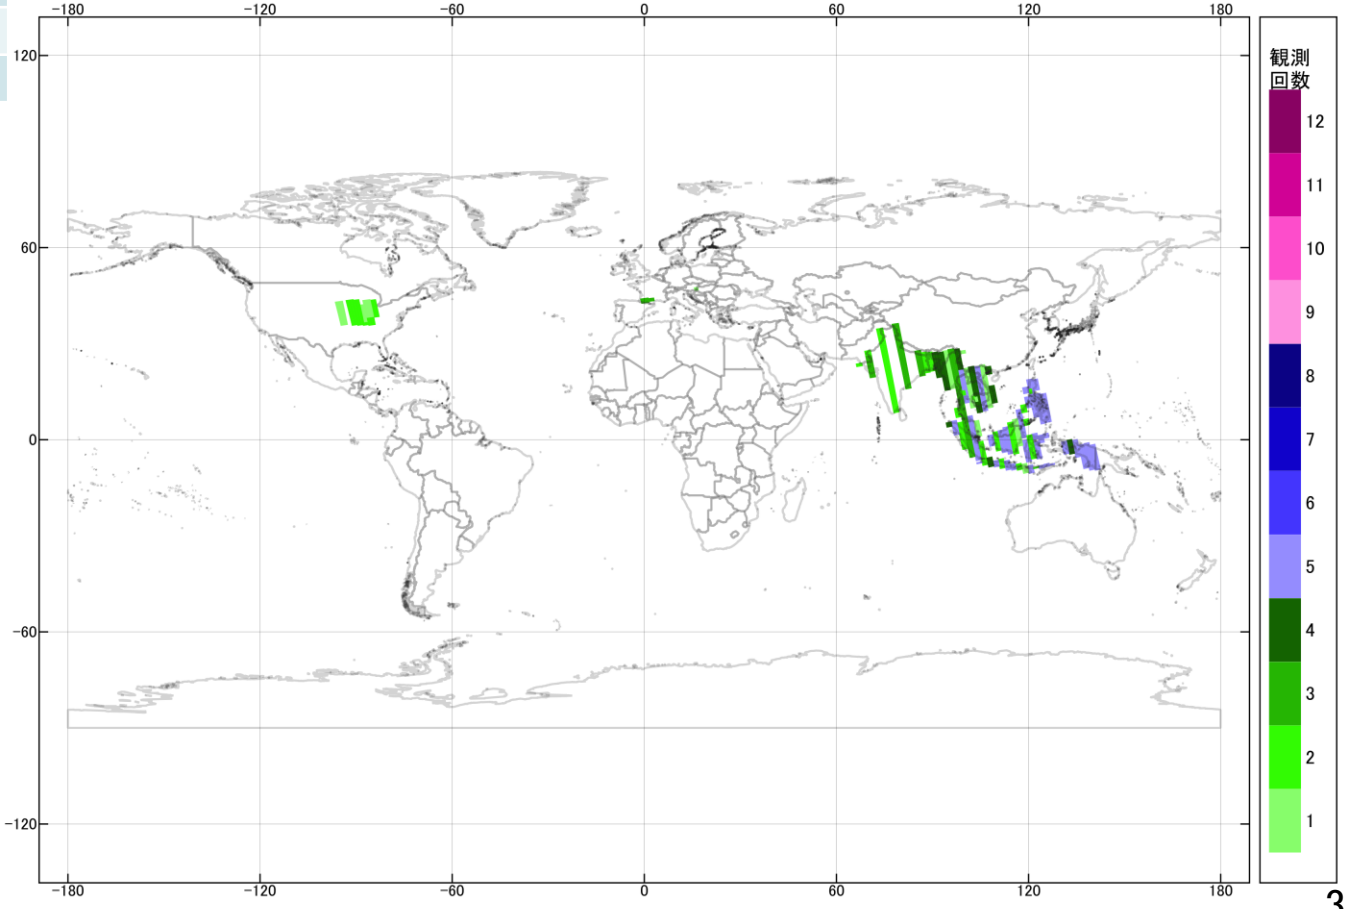


ALOS-4 観測データ取得実績

農業（降交軌道（南行））

テーマ別	観測頻度	分解能	観測モード
水稲監視	2回帰毎	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照
水田メタン評価	2回帰毎	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照
PI要望等	通年	高分解能6m/100km幅	「テーマ別観測モードー覧」参照

取得実績（単位：サブビーム）		
計画シーン数（日々立案計画）	観測シーン数（カタログ公開）	取得率（カタログ公開率）
1,618	1,522	94.1%

【観測エリア】

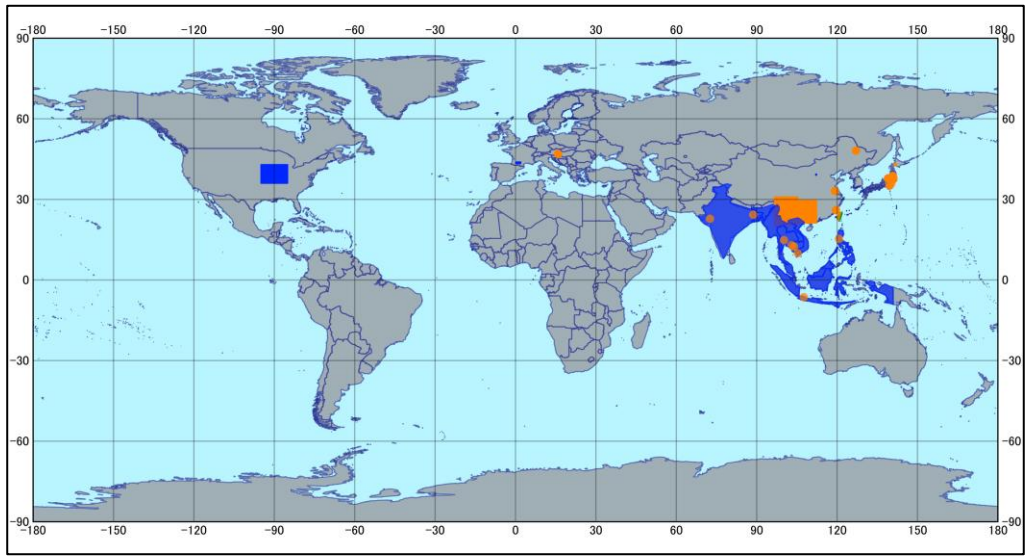

【取得状況】（2026年01月19日～2026年07月19日）

